

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กง) ๐๘๐๕๖/๗๙๔



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพ巴拉นี ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กบบ)
๐๘๐๕.๒/๖ ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

สังที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

๒. ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน
๓. ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน
๔. ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน
๕. รูปแบบการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและประการเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ด้วยปรากฏว่า หน่วยงานของรัฐประสบปัญหากรณีที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญานี้ องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา
จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือบางสัญญาสูงสัญญาละเอียดทั้งงาน ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติต้านการเงินกับผู้ประกอบการ
ที่เข้ามายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากผู้ประกอบการประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่าง
ดำเนินการตามสัญญานี้ที่สุดผู้ประกอบการก็จะคงทิ้งงาน ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย
เพราไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามกำหนดเวลาที่คาดการณ์ไว้ เช่น ต้องเสียค่าเช่าสำนักงาน ต้องดำเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืองบประมาณที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ กับช่วงระยะเวลา
ที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ เนื่องจากราคาวัสดุในขณะนั้นสูงชื้น เป็นต้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐในอนาคต จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ...

๑. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๑.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๑.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๑.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของเงินลินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

ทั้งนี้ หนังสือรับรองของเงินลินเชื่อให้เป็นไปตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒ ข้อยกเว้น

๑.๒.๑ กรณีตามข้อ ๑.๑.๑ - ข้อ ๑.๑.๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาการ ตามพระราชบัญญัติสัม立て ๑๐ ๗๖๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้เขียนทะเบียนผู้ประกอบการ ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๒. แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน

เมื่อลบลงในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องดำเนินการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังนี้

๒.๑ การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติตามตามสัญญา

๒.๑.๑ เมื่อลบลงในสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยให้หน่วยงานของรัฐกำหนดระยะเวลาในการที่คู่สัญญาต้องเร่งเข้ามาดำเนินการตามสัญญาด้วย ซึ่งหากคู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญาภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐควรใช้คุลพินิจในการพิจารณา บอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

๒.๑.๒ กรณีที่คู่สัญญาเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่การดำเนินการตามสัญญา มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งเร่งรัด ให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญา yang มีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้คุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยการพิจารณาให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ ต่อไป

๒.๒ แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการทำงาน โดยพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

๒.๒.๑ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๖ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญาไม่ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๒ เมื่อล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๖ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญามีผลงานประจำเดือนที่ตั้งไว้ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนงาน ประจำเดือน และ

(๒) ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้า เป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๓ ...

๒.๒.๓ เมื่อล่วงเหลือระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว คู่สัญญาไม่ลงงานไม่ถึงร้อยละ ๖๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง โดยความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา

๒.๒.๔ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผลงานสะสมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง

๒.๒.๕ เมื่อครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา หากสัญญาหรือข้อตกลงมีจำนวนค่าปรับ จะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๒ ๙๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙

หากปรากฏว่า เข้าเงื่อนไขกรณีได้ตามข้อ ๒.๒.๑ - ข้อ ๒.๒.๕ หน่วยงานของรัฐ ควรใช้คุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

กรณีตามข้อ ๒.๒.๑ - ข้อ ๒.๒.๕ ไม่ใช้บังคับกับงานก่อสร้างบำรุงทาง

๒.๓ การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญา

กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้คุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/๒ ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง หน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๔) ต่อไป

๓. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาเข้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ดังนี้

๓.๑ เงื่อนไขข้อ ๑.๑.๑ - ข้อ ๑.๑.๔ กำหนดในข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และข้อ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเข้าฯ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

๓.๓ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เอกสารประกวดราคาเข้าฯ เอกสาร ประกวดราคาจ้างฯ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ข้อ ๔ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงาน มาให้ภายใน ... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา” เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าซึ่งสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานจวัดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำแผนการทำงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หันนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

อนึ่ง ...

อนึ่ง ในการกำหนดงวดงานและงวดเงิน หน่วยงานของรัฐควรพิจารณากำหนดงวดงาน และงวดเงินให้เหมาะสมและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันด้วย

ให้นำเงื่อนไขตามข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ ไปใช้กับวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย
๔. หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่

๔.๑ เมื่อ通知ตามข้อ ๑ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวน เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) หรือมีหนังสือเชิญชวน ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

๔.๒ เมื่อ通知ตามข้อ ๒ ให้ใช้บังคับกับสัญญาที่ลงนามจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนในระบบ e - GP หรือมีหนังสือเชิญชวน ตามเงื่อนไขข้อ ๔.๑

สำหรับหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินร่างประกาศและร่างเอกสารเชิญชวนเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในระบบ e - GP ไปแล้วก่อนวันที่ หนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยใช้แบบประกาศแบบเอกสารเชิญชวนเดิม และหนังสือเชิญชวนตามแนวทางเดิมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาย พนักงาน

(นางสาวกุลยา ตันติเมธิ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๕๕๘๘ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว^{ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....} จดข้อเข้ารับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเน้นใช้การยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเชิงกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องของวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วางเงินสินเชื่อภายใต้เงื่อนไข..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อผู้ลงนาม)
.....(ชื่อธนาคาร)

ແບບໜັງສືອັບຮອງວົງເຈີນສິນເຊື່ອອີເລີກທຣອນິກສ

ເລື່ອງ.....

ວັນທີ.....

ເຮືອ ຮັບຮອງວົງເຈີນສິນເຊື່ອ

ຕາມທີ.....(ຫຼອຜູ້ປະທຸງປະບຽນ) ນິຕິບຸກຄ/ບຸກຄລຮຣມຕາ)..... ເລບປະຈຳດ້ວຍ
ຜູ້ເສີຍການຊ່າງເກມ/ເລຂປະການ..... ເລຂປະການ..... ຈະຂອເຂົ້າຮັບການຂຶ້ນທະເບີນ
ເປັນຜູ້ປະກອບການງານ..... ສັງຕາມທັກເກມທີ່ແລ້ວວິທີການຄັດເລືອກເຕີມຜູ້ປະກອບການງານກ່ອສ້າງ
ກໍາທັນດໄທຜູ້ຢືນຂໍ້ເສັນອັດຕິອັນເສັນອັນນັ້ນທີ່ມີມູລຄ່າສຸຂົງຂອງກິຈການທີ່ຍຸດທະເບີນ ມີແຕ່ມີເພີ່ມພອ
ທີ່ຈະເຂົ້າຢືນຂໍ້ເສັນອັນນັ້ນທີ່ມີມູລຄ່າສຸຂົງຂອງກິຈການ ໂດຍຫຼັງຈາກນີ້ແມ່ນສິນເຊື່ອ ๑ ໃນ ๔ ຂອງມູລຄ່າ
ຈົບປະມາລຂອງໂຄງການໃຫ້ຮ່ວມມືການທີ່ຢືນຂໍ້ເສັນອັນນັ້ນທີ່ມີມູລຄ່າສຸຂົງຂອງກິຈການ.....
(ຫຼອຮານາຄາ). ວິນຍຸງວົງເຈີນສິນເຊື່ອ ເພື່ອປະກອບການພິຈານາດ້ວຍ ນັ້ນ

.....(ຫຼອຮານາຄາ)..... ຂອບຮອງຈ່າ..... (ຫຼອຜູ້ປະກອບການ ນິຕິບຸກຄ/
ບຸກຄລຮຣມຕາ)..... ມົງເຈີນທຸນທຸນເວີ່ມີນິວເຈີນໄຟ່ຕໍ່ກ່າວ່າ..... ບາທ
(.....ຈຳນວນເຈີນເປັນອັກຊຣ.....) ແລ້ວຍືນຕີໃຫ້ຮັງເຈີນເສັ້ນທີ່ກ່າຍໄຟ່ນິວເຈີນ..... ບາທ
(.....ຈຳນວນເຈີນເປັນອັກຊຣ.....)


ຂອແສດງຄວາມນັບດືອ
.....(ຫຼອຮານາຄາ).....

** ເອກສາຮອບບັນຫຼັກພິທີຮະບອບອີເລີກທຣອນິກສ **

ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาก่อสร้าง	เป็นเงิน	%
1	งานที่ได้โอนรับเงิน					
	รายการ...	ลบ.น.				
	รายการ...	ลบ.น.				
2	งานที่ไม่ได้โอน					
	รายการ...	ลบ.น.				
	รายการ...	ลบ.น.				
		รวม		-	0%	

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...							

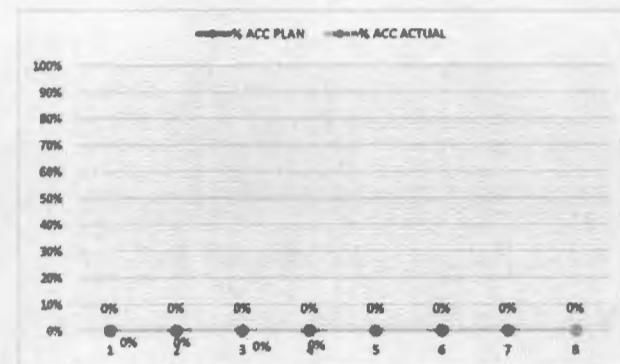

Money							
AccMoney							
Diff Money							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

หมายเหตุ: 1) การยังคงต่อเนื่องการก่อสร้างตามแผนที่บันทึกไว้คราวนี้ จำนวน 8 เดือน

2) หมายเหตุ: ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่บันทึกไว้คราวนี้และระยะเวลาการก่อสร้าง เป็น งานที่ได้โอนรับเงิน ภาระครบทุกประชาราษฎร์ จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างคราวนี้)

หมายเหตุ: โดยระยะเวลาที่ถูกบันทึกไว้คราวนี้เป็นการก่อสร้างตามแผนงานประจำที่บันทึกไว้คราวนี้ ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้าง ต้องเป็น 100 %

หมายเหตุ: ภาระคราภัยและรายรับ ภาระงานจากวิธีของความแผนงานที่บันทึกไว้คราวนี้จะถูกหักออกจากยอดภาระคราภัยและรายรับ


โดยระยะเวลาที่บันทึกไว้คราวนี้ ภาระงานจากภาระคราภัยและรายรับจะถูกหักออกจากยอดภาระคราภัยและรายรับ

โดยระยะเวลาที่บันทึกไว้คราวนี้ ภาระงานจากภาระคราภัยและรายรับจะถูกหักออกจากยอดภาระคราภัยและรายรับ

ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานที่ต้องรีบทำให้เสร็จ					
	a1	ล.t.ช.ล.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ล.t.ช.ล.	120	2,000	240,000	8%
2	งานที่ไม่งาน					
	b1	ล.t.ช.ล.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ล.t.ช.ล.	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม		3,040,000	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8
ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
25	25	25	25				
	50	50		20	20	20	20
				20	25	25	25

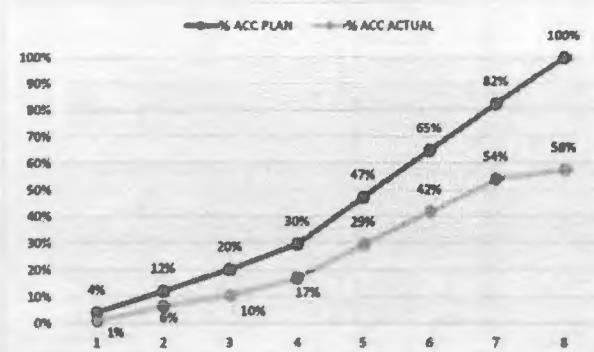


Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							

หมายเหตุ:

- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการต้องรีบทำตามแผนงานที่ต้องรีบทำ จำนวน 8 เดือน
- 2) Money หมายความว่า ระยะเวลาการต้องรีบทำตามแผนงานที่ต้องรีบทำ จำนวน 4 เดือน 1. งานที่ต้องรีบทำให้เสร็จ จำนวน 4 เดือน 2. งานที่ต้องรีบทำให้เสร็จ จำนวน 5 เดือน
- 3) -25 หมายความว่า กำหนดระยะเวลาที่ต้องรีบทำให้เสร็จ จำนวน 5 เดือน แต่ต้องใช้เวลา 100 วัน ตัวอย่างเช่น กำหนดระยะเวลา 100 วันต้องช้ากว่ากำหนด 100 วัน หรือต้อง
- 4) Money คุณภาพของรายการการ ดำเนินงานจากต้องรีบทำตามแผนงานจะต้องเป็นคุณภาพที่ดีกว่าคุณภาพของรายการการ
- 5) % PLAN หมายความว่าแผนงานที่ต้องรีบทำ กำหนดจากคุณภาพของแผนงานที่ต้องรีบทำตามแผนงานที่ต้องรีบทำให้เสร็จ

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

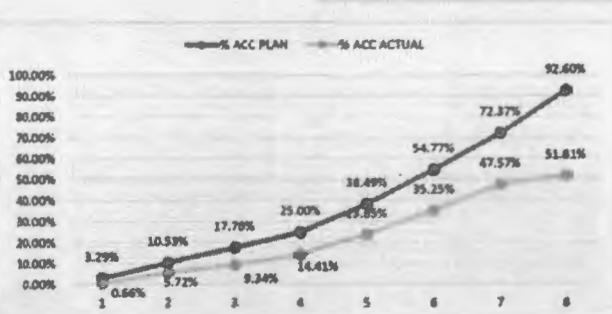ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	ระยะเวลาไม่กิน 1 ปี			ระยะเวลา ก 1 ใน 2		ระยะเวลา ก 3 ใน 4		ตัวชี้วัดคุณภาพ																																													
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8																																													
1	งานที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%	20	20	20	20																																																
		a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%		50	50																																																	
2	งานฝ่ายขาย	b1	ลต.ด.	400	2,000	800,000	26%				15	20	15	20	30																																												
		b2	ลต.ด.	300	5,000	1,500,000	49%				10	25	25	25	25																																												
รวม					3,040,000	100%																																																					
$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29 \%$																																																											
																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>% ACC PLAN</th> <th>% ACC ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3.29%</td><td>0.66%</td></tr> <tr><td>2</td><td>10.53%</td><td>5.72%</td></tr> <tr><td>3</td><td>17.70%</td><td>9.34%</td></tr> <tr><td>4</td><td>25.00%</td><td>14.41%</td></tr> <tr><td>5</td><td>38.49%</td><td>19.35%</td></tr> <tr><td>6</td><td>54.77%</td><td>35.25%</td></tr> <tr><td>7</td><td>72.87%</td><td>47.57%</td></tr> <tr><td>8</td><td>92.60%</td><td>91.81%</td></tr> </tbody> </table>							Month	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL	1	3.29%	0.66%	2	10.53%	5.72%	3	17.70%	9.34%	4	25.00%	14.41%	5	38.49%	19.35%	6	54.77%	35.25%	7	72.87%	47.57%	8	92.60%	91.81%																										
Month	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL																																																									
1	3.29%	0.66%																																																									
2	10.53%	5.72%																																																									
3	17.70%	9.34%																																																									
4	25.00%	14.41%																																																									
5	38.49%	19.35%																																																									
6	54.77%	35.25%																																																									
7	72.87%	47.57%																																																									
8	92.60%	91.81%																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>Money</th> <th>AccMoney</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>100,000</td><td>220,000</td></tr> <tr><td>2</td><td>100,000</td><td>320,000</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>540,000</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>760,000</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>1,170,000</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>1,665,000</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>2,200,000</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>2,815,000</td></tr> </tbody> </table>							Month	Money	AccMoney	1	100,000	220,000	2	100,000	320,000	3		540,000	4		760,000	5		1,170,000	6		1,665,000	7		2,200,000	8		2,815,000																										
Month	Money	AccMoney																																																									
1	100,000	220,000																																																									
2	100,000	320,000																																																									
3		540,000																																																									
4		760,000																																																									
5		1,170,000																																																									
6		1,665,000																																																									
7		2,200,000																																																									
8		2,815,000																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Month</th> <th>% PLAN</th> <th>% ACC PLAN</th> <th>% ACC ACTUAL</th> <th>% ACC DIFF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3.29%</td><td>3.29%</td><td>0.66%</td><td>2.63%</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>10.53%</td><td>5.72%</td><td>4.80%</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>17.70%</td><td>9.34%</td><td>8.42%</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>25.00%</td><td>14.41%</td><td>10.59%</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>38.49%</td><td>19.35%</td><td>14.64%</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>54.77%</td><td>35.25%</td><td>19.52%</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>72.87%</td><td>47.57%</td><td>24.80%</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>92.60%</td><td>91.81%</td><td>40.99%</td></tr> </tbody> </table>							Month	% PLAN	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL	% ACC DIFF	1	3.29%	3.29%	0.66%	2.63%	2		10.53%	5.72%	4.80%	3		17.70%	9.34%	8.42%	4		25.00%	14.41%	10.59%	5		38.49%	19.35%	14.64%	6		54.77%	35.25%	19.52%	7		72.87%	47.57%	24.80%	8		92.60%	91.81%	40.99%								
Month	% PLAN	% ACC PLAN	% ACC ACTUAL	% ACC DIFF																																																							
1	3.29%	3.29%	0.66%	2.63%																																																							
2		10.53%	5.72%	4.80%																																																							
3		17.70%	9.34%	8.42%																																																							
4		25.00%	14.41%	10.59%																																																							
5		38.49%	19.35%	14.64%																																																							
6		54.77%	35.25%	19.52%																																																							
7		72.87%	47.57%	24.80%																																																							
8		92.60%	91.81%	40.99%																																																							
<p>หมายเหตุ: 1) การตั้งค่าต่อ 8 เดือน หมายความว่าการท่องเที่ยวตามแผนที่กำหนดงานที่ให้ไว้ในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 ได้เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้</p> <p>2) หมายเหตุ: ระยะเวลาการท่องเที่ยวตามแผนที่กำหนดงานที่ให้ไว้ในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 4 ได้เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ แต่เดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 8 ไม่ได้ตั้งค่าไว้</p> <p>3) หมายเหตุ: ให้คะแนนของงานที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการท่องเที่ยวตามแผนงานประจำสำหรับเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 รวมกัน 100 %</p> <p>4) Money หมายความว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการท่องเที่ยวตามแผนงานที่ให้ไว้ในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8</p> <p>5) AccMoney หมายความว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการท่องเที่ยวตามแผนงานที่ให้ไว้ในเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 รวมกัน 100 %</p> <p>6) % PLAN หมายความว่าแผนที่กำหนดงาน คือจำนวนจากเดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 8 ตามที่ตั้งค่าไว้</p> <p>7) % ACC PLAN หมายความว่าแผนที่กำหนดงานที่จริง</p> <p>8) % ACTUAL หมายความว่าจำนวนการท่องเที่ยวตามที่ตั้งค่าไว้</p> <p>9) % ACC ACTUAL หมายความว่าจำนวนการท่องเที่ยวตามที่จริง</p> <p>10) % ACC DIFF หมายความว่าความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวตามที่ตั้งค่าไว้และตามที่จริง</p>																																																											

ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

แผนภูมิ 1 ใน 2

แผนภูมิ 3 ใน 4

ผลลัพธ์ที่ได้

รายการ	ประจำ	จำนวนเงิน	ราคารอบปี	เป้าเดือน	%	แผนภูมิ 1 ใน 2												แผนภูมิ 3 ใน 4								ผลลัพธ์ที่ได้
						เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6	เดือน 7	เดือน 8	เดือน 9	เดือน 10	เดือน 11	เดือน 12	เดือน 13	เดือน 14	เดือน 15	เดือน 16	เดือน 17	เดือน 18	เดือน 19	เดือน 20	
1 ค่าใช้จ่ายเดือนแรก						20	20	15	15	25																
	a1	กศ.ด.	100	5,000	500,000	0%																				
	a2	กศ.ด.	120	2,000	240,000	0%																				
	a3	กศ.ด.	150	2,000	300,000	0%																				
	a4	กศ.ด.	130	2,000	300,000	0%																				
2 รายรับ																										
	b1	กศ.ด.	400	2,000	800,000	17%																				
	b2	กศ.ด.	200	5,000	1,000,000	16%																				
	b3	กศ.ด.	300	10,000	9,000,000	99%																				
		TOT			6,340,000	100%																				

$$\frac{105,000}{5,840,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	180,000	135,000	75,000	360,000	410,000	310,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000		
Actual	100,000	700,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000		
% PLAN	1.63%	1.63%	2.28%	1.22%	6.00%	5.84%	4.66%	5.09%																		
% ACC PLAN	1.63%	3.24%	5.46%	6.44%	6.44%	12.54%	19.22%	24.27%																		
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	0%	2%	1%																		
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	8%	12%	15%																		
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	3%	7%	11%																		
% PLN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																		
% PLN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%																		

- 1 ค่าใช้จ่ายเดือนแรก หมายความว่าค่าใช้จ่ายเดือนแรกของแผนภูมิ 1 ใน 2 หรือเดือน 1 ใน 4 ปี (ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 1)
- 2 แผนภูมิ 3 ใน 4 หมายความว่าเป็นแผนภูมิที่แสดงค่าใช้จ่ายเดือนต่อเดือนของปีที่ 4 (เดือน 13-20) ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 1
- 3 75 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเดือนแรกที่ต้องการให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเดือนแรกที่ 100 %
- 4 Money คือจำนวนเงินที่ต้องการให้ได้ในแต่ละเดือนของปีที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 1
- 5 % PLN หมายความว่าเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายเดือนแรกที่ต้องการให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเดือนแรกที่ 100 %



คู่มือ

การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา และประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 124

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

(สำหรับหน่วยงานของรัฐ)

กลุ่มงานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง

สารบัญ

	หน้าที่
1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา.....	1
2. การกำหนดหลักฐานการยื่นข้อเสนอ.....	1
3. การกำหนดเงื่อนไขใน Template เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์.....	2
4. การกำหนดเงื่อนไขใน Template ประกาศเชิญชวน.....	6

ขั้นตอนจัดทำเอกสารประกันราคาและประกาศเชิญชวน

1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 1) หัวข้อ C๒ ต้องการกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารหรือไม่ คลิก “ต้องการ”
- 2) บันทึกคุณสมบัติอื่นๆ “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 ดังนี้”

The screenshot shows a bidding document template with the following sections:

- ข้อมูลผู้เสนอราคา** (Bidder Information): Fields A1 (เลขที่ใบอนุญาต) and A2 (ชื่อผู้เสนอราคา).
- ข้อกำหนดของผู้เสนอราคา** (Bidding Conditions):
 - A3 (คุณประการทางด้านคุณภาพ): "ต้องการและสามารถให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานให้ได้"
 - A31 (คุณและเอกสารไม่เรียกว่า): "ต้องมีความสามารถในการดำเนินการให้ได้"
 - A4 (คุณและเอกสารไม่ได้ระบุ): "ต้องมีความสามารถในการดำเนินการให้ได้"
- เอกสารแนบท้ายและการประกันราคา** (Attachments and Bid Security):
 - B1 (แนบมาเพื่อการเสนอราคา): "control.pdf" (Selected file, size 209.3 KB)
 - Notes:
 - 1. เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารไฟล์ .pdf และมีขนาดไม่เกิน 100 เมกะไบต์
 - 2. ระบุ[Browse] กรณีแนบไฟล์ไม่เกิน 100 เมกะไบต์ และกด[Browse] กรณีแนบไฟล์ 100 เมกะไบต์
- คุณสมบัติของผู้เสนอราคา** (Qualification Requirements):
 - C1 (ผู้เสนอราคาไม่ได้เสนอเอกสารเพื่อขอทราบผลการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไว้ใน): ต้องการ ไม่ต้องการ
 - C2 (ผู้เสนอราคาไม่ได้เสนอเป็นบัญชีผลิตภัณฑ์ หรือไม่): ต้องการ ไม่ต้องการ
 - C3 (ผู้เสนอการเสนอคุณสมบัติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารกำหนดให้ไว้): ต้องการ ไม่ต้องการ
- หมายเหตุ**: "ผู้ที่มีชื่อเดียวกันหรือมีชื่อคล้ายกันก็ถือว่าเป็นผู้เสนอราคาเดียวกัน กรณการรับรู้จะมีผู้ราชการจัดซื้อจัดจ้างและภาระในการรับทราบผลการตัดสุดท้าย ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ 0405.2 / ว.....ลงวันที่....."
- หลักฐานการมีบัญชีเดียว**: "ผู้เสนอการ ไม่ได้เสนอเอกสารเพื่อขอทราบผลการตัดสินใจของคณะกรรมการที่ไว้ใน กรณการรับรู้จะมีผู้ราชการจัดซื้อจัดจ้างและภาระในการรับทราบผลการตัดสุดท้าย ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ) ที่ 0405.2 / ว.....ลงวันที่....."

2. การกำหนดหลักฐานการยื่นข้อเสนอ

3) หัวข้อ บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 กดปุ่ม “เพิ่มเติมเอกสาร”

หลักฐานการยื่นขอเสนอ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

* ในระบุเอกสารอ้างความที่ส่วนราชการที่ดำเนินการขออนุมัติการดำเนินการที่ต้องการให้เป็นไปตามกฎหมายและมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย

มูลค่าที่มี เป็นดัง

3

4) ระบุจำนวนรายการที่ต้องการเพิ่ม

5) กดปุ่ม “ตกลง”

6) บันทึกรายการเอกสาร “เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ”

7) ทำเครื่องหมาย ✓ ที่เอกสารจำเป็นต้องยื่น

8) กดปุ่ม “บันทึก”

9) กดปุ่ม “ออก”

เอกสารเพิ่มเติม

* ระบุจำนวนรายการที่ต้องการเพิ่ม 1 ตกลง

รายการ

a. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ

เอกสารจำเป็นต้องยื่นไว้ที่ร้านค้า

6

7

8

9

ยกเลิกข้อมูล

3. การกำหนดเงื่อนไขใน Template เอกสารประวัติราคาก่อสร้าง

10) ระบุข้อความเพิ่มเติมใน Template ร่างเอกสารประวัติราคาก่อสร้าง หัวข้อ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ


ข้อ 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ.....ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงต่ำเป็นบาง 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ


(2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าทุนแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
- (2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
- (2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
- (2.5) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 60 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท
- (2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
- (2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท
- (2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
- (2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องระบุ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
- (3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่าງบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ในวันลงนามในสัญญา
- (4) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร)
- (5) กรณีตาม (1) – (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
- (5.1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ
- (5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(5.3) งานก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเป็นองค์รวมไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีผลใช้บังคับ

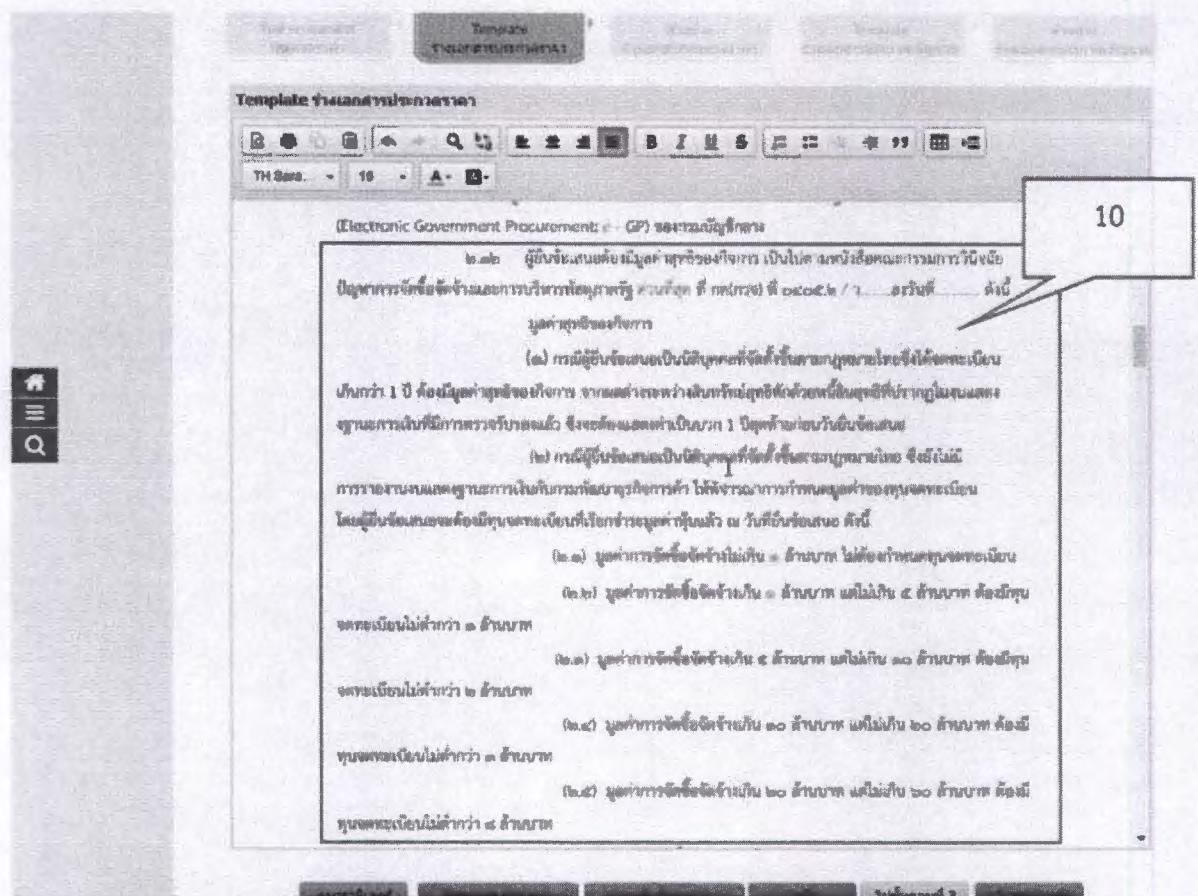

11) ระบุข้อความเพิ่มเติมใน Template ร่างเอกสารประกวดราคา หัวข้อ การเสนอราคา “ข้อ 4.8 คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า สัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา”

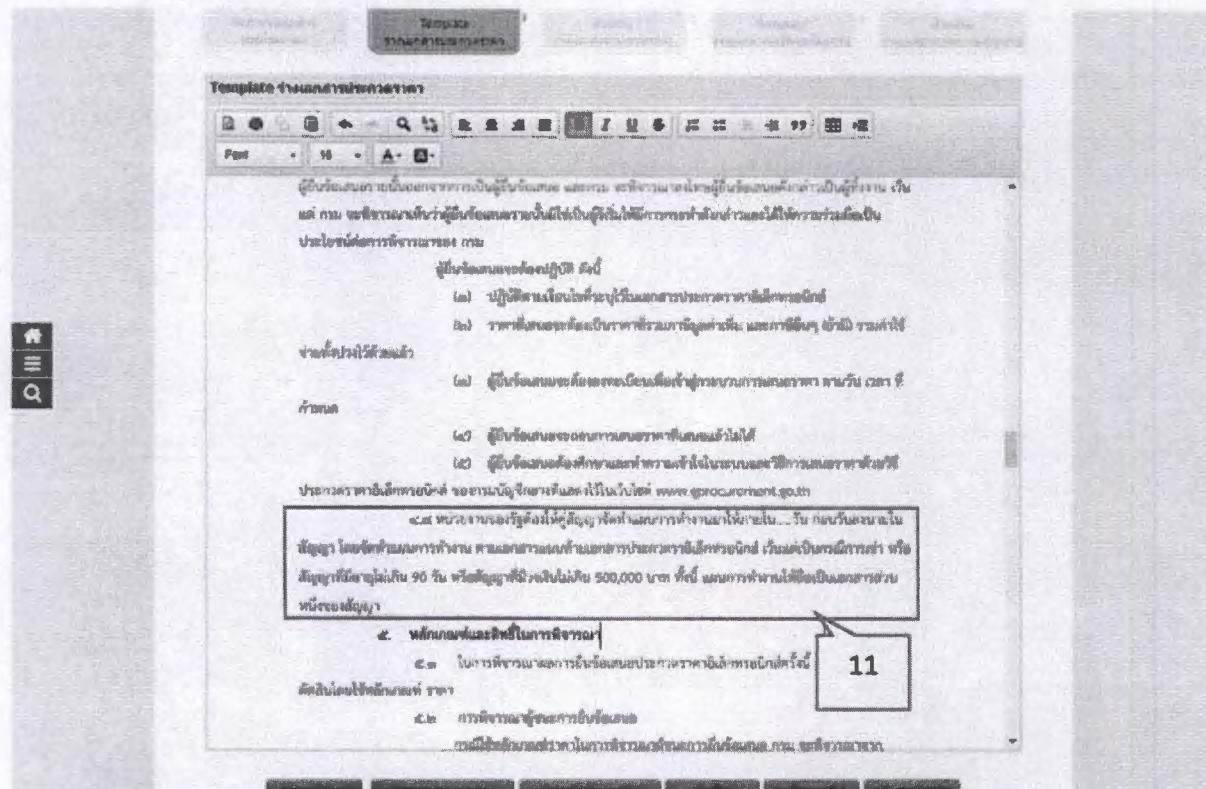

4. การกำหนดเงื่อนไข Template ประกาศเชิญชวน

12) ระบุข้อความเพิ่มเติมตามข้อ 3 (1) – (5) ใน Template ประกาศเชิญชวน ข้อ 12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีค่าสุทธิของกิจการ..... ดังนี้

