



คู่มือการแก้ไขสัญญา
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

จัดทำโดย

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

เมษายน 2567

สารบัญ

หน้าที่


1. ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP	1
2. แก้ไขสัญญาและรายละเอียดอื่น ๆ (แก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงงานและวงเงิน)	4
3. แก้ไขสัญญาเกี่ยวกับวงงานวงเงิน (แก้ไขสัญญาที่กระทบวงงานและวงเงิน)	11
4. การดำเนินการหลังการแก้ไขสัญญา	20

ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาในระบบ e-GP

1. หน่วยงานของรัฐ Login เข้าสู่ระบบ

1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th>

1.2 กดปุ่ม

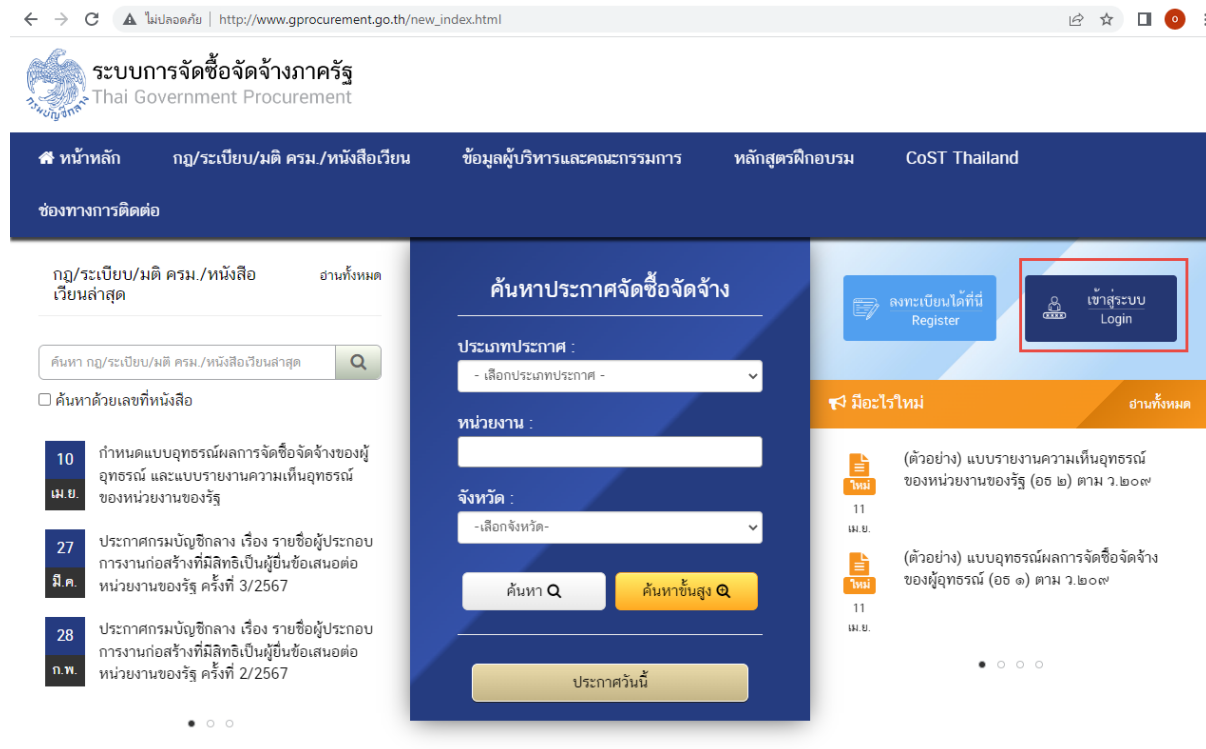

1.2

1.3 ระบุ “รหัสผู้ใช้”

ระบุ “รหัสผ่าน”

1.4 กดปุ่ม



 **e-GP** ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Government Procurement : e - GP

เข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน

1.5 กดเลือก



1.5






เพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง



เพิ่มโครงการ


1.6 กดเลือกเมนู สัญญาและหลักประกัน

1.6

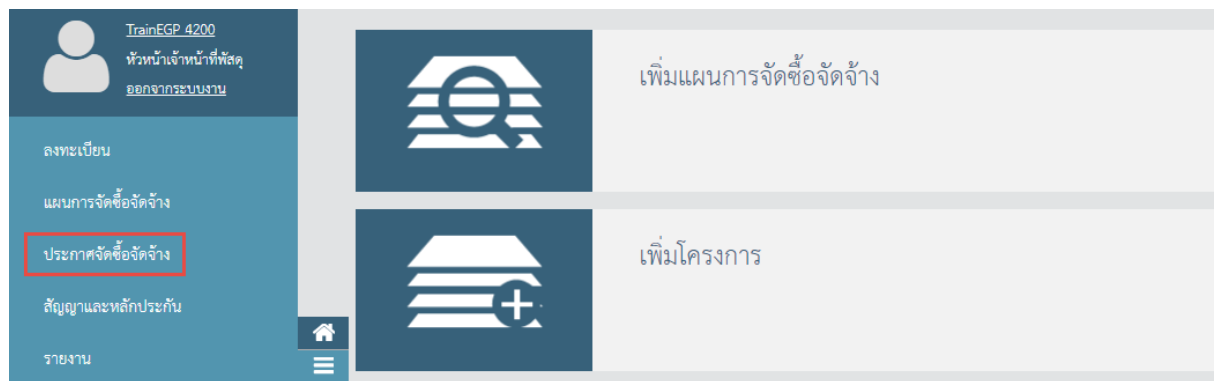


1.7 กดเลือกเมนูย่อย บริหารสัญญา

1.7

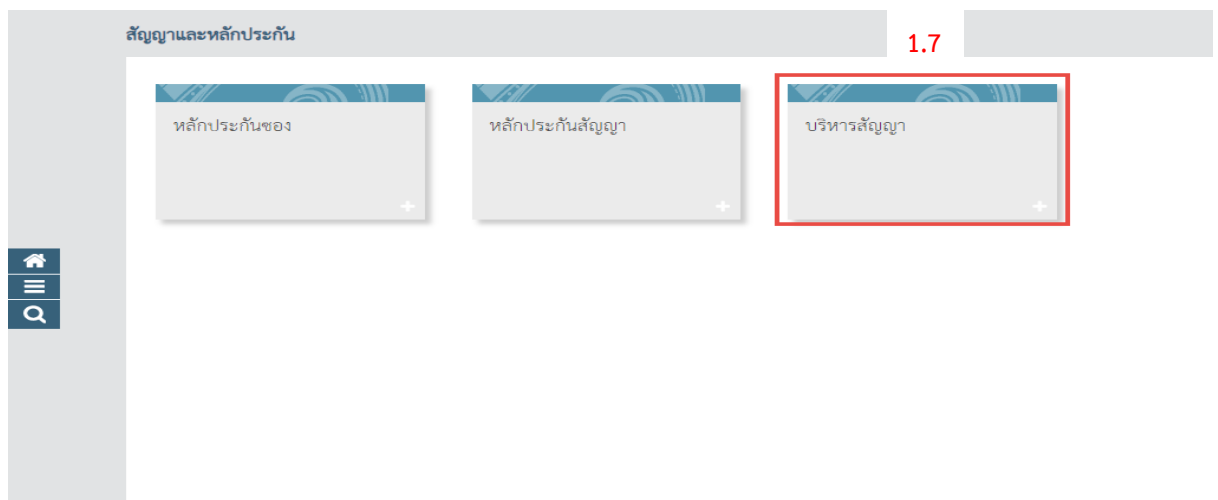

1.8 กดเลือกเมนูย่อย แก้ไขสัญญา

1.8

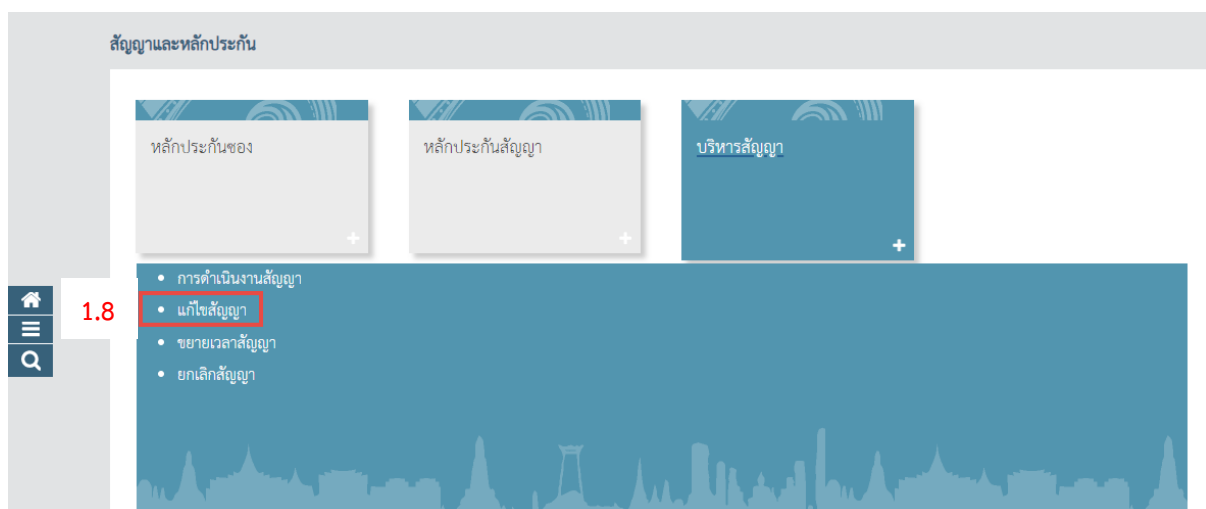

2 หน่วยงานของรัฐ เลือกโครงการที่ต้องการแก้ไขสัญญา

2.1 ค้นหาโครงการที่ต้องการแก้ไข

2.2 คลิกที่ **รายละเอียด/แก้ไข** ของโครงการที่ต้องการแก้ไข

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ค้นหาข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

สำนักงาน 1509902951 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบรท 1)

ชื่อโครงการ

ค้นหา ล้างตัวเลือก ค้นหาขั้นสูง

ชื่อสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่สัญญา		จำนวนเงิน ตามสัญญา	สถานะสัญญา	รายละเอียด		
			ตั้งแต่	สิ้นสุด					
เลขที่โครงการ 67049000244 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน รศ.กร ทัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 2,500,000.00 บาท	3609900938029	แล้วไป	22/2567	240	01/05/2567	26/12/2567	1,877,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
เลขที่โครงการ 67039001861 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 3,000,000.00 บาท	3609900938029	แล้วไป	99/2567	60	30/03/2567	28/05/2567	1,877,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	รายละเอียด/แก้ไข
เลขที่โครงการ 67039001660 - ซื้อเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สทต.หน่วยท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง 400,000.00 บาท									

หน่วยงานของรัฐ – แก้ไขสัญญา

3.1 แก้ไขสัญญาและรายละเอียดอื่น ๆ (แก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบงวดงานและงวดเงิน)

3.1.1 กดปุ่ม

แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่น ๆ

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง			
ชื่อผู้คำ/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	แล็บโปร		
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3609900938029		
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง		
เลขที่สัญญา	22/2567	ดูรายละเอียดสัญญา	
ลงวันที่	30/04/2567		
เลขคุมสัญญา	670422000004		
วันที่เริ่มสัญญาตั้งแต่	01/05/2567	จนถึง	26/12/2567
จำนวนเงินตามสัญญา	1,877,000.00 บาท		
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว		

ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง					
ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา

หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงจางงวดเงินให้เลือก แก้ไขวงจางงวดเงิน
2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงจางงวดเงินให้เลือก แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ

แก้ไขวงจางงวดเงิน แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ กลับสู่หน้าหลัก

3.1.1

3.1.2 เลือก

หมวดสัญญาที่ต้องการแก้ไข

3.1.3 กดปุ่ม

บันทึก

3.1.2

* เลือกหมวดสัญญาที่ต้องการแก้ไข

D1	☐ 1.ข้อตกลงว่าจ้าง	D2	☐ 2.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
D3	☐ 3.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	D4	☐ 4.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
D5	☐ 5.เงินค่าจ้างล่วงหน้า	D6	☐ 6.การหักเงินประกันผลงาน
D7	☐ 7.กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา	D8	☐ 8.ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง
D9	☐ 9.การจ้างช่วง	D10	☐ 10.การควบคุม งานของผู้รับจ้าง
D11	☐ 11.การรับผิดชอบผู้รับจ้าง	D12	☐ 12.การจ่ายเงินแก่ผู้จ้าง
D13	☐ 13.การตรวจงานจ้าง	D14	☐ 14.แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน
D15	☐ 15.การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง	D16	☐ 16.งานพิเศษและการแก้ไขงาน
D17	☒ 17.ค่าปรับ	D18	☐ 18.สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังยกเลิกสัญญา
D19	☐ 19.การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย	D20	☐ 20.การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
D21	☐ 21.การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา	D22	☐ 22.การใช้เรือไทย
D23	☐ 23.มาตรฐานฝีมือช่าง	D24	☐ 24.อื่นๆ (แก้ไข,นอกเหนือข้อ 1-12, เพิ่มเติม)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

3.1.3

3.1.4 กดปุ่ม

ตกลง

3.1.4

egp3training.cgd.go.th บอกว่า
ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่

ตกลง ยกเลิก

การคำ กระทรวงพาณิชย์

ที่ 012345678

B20 หนังสือรับรองการจดทะเบียนลงวันที่ 01/06/2545 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดตปปป)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

B21 * ผู้ลงนามเป็นผู้รับมอบอำนาจหรือไม่ ☐ มอบอำนาจ ☒ ไม่มอบอำนาจ

B22 หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดตปปป)

B23 * ตำแหน่ง นาย

B24 * ชื่อ ชน

B25 * นามสกุล มงคล

* เลือกหมวดสัญญาที่ต้องการแก้ไข

D1	☐ 1.ข้อตกลงว่าจ้าง	D2	☐ 2.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
D3	☐ 3.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	D4	☐ 4.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
D5	☐ 5.เงินค่าจ้างล่วงหน้า	D6	☐ 6.การหักเงินประกันผลงาน
D7	☐ 7.กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา	D8	☐ 8.ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง
D9	☐ 9.การจ้างช่วง	D10	☐ 10.การควบคุม งานของผู้รับจ้าง
D11	☐ 11.การรับผิดชอบผู้รับจ้าง	D12	☐ 12.การจ่ายเงินแก่ผู้จ้าง
D13	☐ 13.การตรวจงานจ้าง	D14	☐ 14.แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน
D15	☐ 15.การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง	D16	☐ 16.งานพิเศษและการแก้ไขงาน
D17	☒ 17.ค่าปรับ	D18	☐ 18.สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
D19	☐ 19.การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย	D20	☐ 20.การทาบบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
D21	☐ 21.การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา	D22	☐ 22.การใช้เรือไทย
D23	☐ 23.มาตรฐานฝีมือช่าง	D24	☐ 24.อื่นๆ (แก้ไข,นอกเหนือข้อ 1-12, เพิ่มเติม)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959

FCON7005

3.1.5 กดปุ่ม

ไปขั้นตอนที่ 2

เพื่อบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

* เลือกหมวดสัญญาที่ต้องการแก้ไข

D1	☐ 1.ข้อตกลงว่าจ้าง	D2	☐ 2.เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
D3	☐ 3.หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา	D4	☐ 4.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
D5	☐ 5.เงินค่าจ้างล่วงหน้า	D6	☐ 6.การหักเงินประกันผลงาน
D7	☐ 7.กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา	D8	☐ 8.ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง
D9	☐ 9.การจ้างช่วง	D10	☐ 10.การควบคุม งานของผู้รับจ้าง
D11	☐ 11.การรับผิดชอบผู้รับจ้าง	D12	☐ 12.การจ่ายเงินแก่ผู้จ้าง
D13	☐ 13.การตรวจงานจ้าง	D14	☐ 14.แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน
D15	☐ 15.การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง	D16	☐ 16.งานพิเศษและการแก้ไขงาน
D17	☒ 17.ค่าปรับ	D18	☐ 18.สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
D19	☐ 19.การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย	D20	☐ 20.การทาบบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
D21	☐ 21.การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา	D22	☐ 22.การใช้เรือไทย
D23	☐ 23.มาตรฐานฝีมือช่าง	D24	☐ 24.อื่นๆ (แก้ไข,นอกเหนือข้อ 1-12, เพิ่มเติม)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

3.1.5

10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959

FCON7005

3.1.6 บันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง และกดปุ่ม

บันทึก

3.1.7. กดปุ่ม

ไปขั้นตอนที่ 3

ระบบจะแสดง Template การแก้ไขสัญญา

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 เลือกหมวดที่ ต้องการแก้ไข 2 บันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 3 Template การแก้ไขสัญญา 4 ตัวอย่างการแก้ไขสัญญา

สัญญาข้อ ๑๗. ค่าปรับ

เดิม

ประเภทการปรับ: หวังผลสำเร็จของงานพร้อมกัน (ปรับรวม) ☐ ค่าปรับอัตราร้อยละ ☐ จำนวนเงินค่าปรับ

L3: 1877.00 บาทต่อ <ตัวเลือกหน่วยนับ> วัน

ค่าจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งวันละ 350.00 บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

ใหม่

L1: * ประเภทการปรับ: หวังผลสำเร็จของงานพร้อมกัน (ปรับรวม) ☐ ค่าปรับอัตราร้อยละ ☐ จำนวนเงินค่าปรับ

L2: 1,870.00 บาทต่อ <ตัวเลือกหน่วยนับ> วัน

L3: * ค่าจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งวันละ 350.00 บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

เอกสารแนบการแก้ไขสัญญา

ลำดับที่	รายการ	ชื่อไฟล์แนบ
เพิ่ม/แก้ไขเอกสารแนบ (เอกสารแนบท้าย จะต้องเป็นเอกสารนามสกุล .pdf หรือ .zip และมีขนาดไม่เกิน 2 เมกะไบต์)		

ผู้ลงนาม

ผู้ว่าจ้าง

N1-1: * คำนามหน้า: นาย

N1-2: * ชื่อผู้ลงนาม: วัชรชัย

N1-3: * นามสกุลผู้ลงนาม: หม่อมปลัด

ผู้รับจ้าง

N2-1: * คำนามหน้า: นาย

N2-2: * ชื่อผู้ลงนาม: ชนะ

N2-3: * นามสกุลผู้ลงนาม: มงคล

พยาน

N3-1: * คำนามหน้า: นาย

N3-2: * ชื่อผู้ลงนาม: สายโรจน์

N3-3: * นามสกุลผู้ลงนาม: ยอดอินทร์

พยาน

N4-1: * คำนามหน้า: นาง

N4-2: * ชื่อผู้ลงนาม: กฤติกา

N4-3: * นามสกุลผู้ลงนาม: จิตตง

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกวันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 ยกเลิกรายการข้อมูล บันทึกชั่วคราว บันทึก ไปขั้นตอนที่ 3 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สนจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ก

3.1.6

3.1.7

6951 - 6959

FCOM7005

3.1.8 กดปุ่ม

บันทึก

3.1.9 กดปุ่ม

ไปขั้นตอนที่ 4

ระบบจะแสดงตัวอย่างการแก้ไขสัญญา

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
เลือกหมวดที่
ต้องการแก้ไข

2
บันทึกข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลง

3
Template การ
แก้ไขสัญญา

4
ตัวอย่าง
การแก้ไขสัญญา

Template การแก้ไขสัญญา

Source
Font
Size

หรือวันที่ผู้จ้างได้ขอยกให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้จ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้จ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้จ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้จ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง
ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้จ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้จ้างได้แจ้งข้อเรียก
ร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน
บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

Template มาตรฐาน

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2

บันทึก

ไปขั้นตอนที่ 4

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON7005

3.1.8

3.1.9

3.1.10 กดปุ่ม

บันทึกเลขที่และวันที่

เพื่อบันทึกเลขที่และวันที่ในสัญญา

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
เลือกหมวดที่
ต้องการแก้ไข

2
บันทึกข้อมูล
เปลี่ยนแปลง

3
Template การ
แก้ไขสัญญา

4
ตัวอย่าง
การแก้ไขสัญญา

ตัวอย่างการแก้ไขสัญญา



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบรรม 1) ตำบล/แขวง บางนาท อำเภ/เขต เมือง นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส เมื่อวันที่ ระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบรรม 1) โดย นาย วิฑูรย์ หม่อมปัสดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ เส็นโปร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ถนนพชรเกษม โดยนายชนะ มงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘ ลงวันที่ ๑

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้วันสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๕๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขอยกให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ หม่อมปัสดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชนะ มงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกฤติกา รุดคง)

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 3

พิมพ์

บันทึกเลขที่และวันที่

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON7005

3.1.10

3.1.11 กดปุ่ม

บันทึก

เพื่อแสดงตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึกเลขที่และวันที่ 2 ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

สัญญาเลขที่และวันที่

R1	* สัญญาเลขที่	22/2567
R2	* สัญญาจัดทำเมื่อวันที่	30/04/2567 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววคคปปปป)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

บันทึก ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่ ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สม) 3.1.11 นพธรรม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON7005

3.1.12 กดปุ่ม

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึกเลขที่และวันที่

2
ตัวอย่างสัญญาหรือข้อตกลง

ตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบร. ๑) ตำบล/แขวง บางนาท อําเภอบางนาท จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบร. ๑) โดย นายวิฑูรย์ หม่อมปัสดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ แสบโปร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ ถนนเพชรเกษม โดยนายชนะ มงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘ ลงวันที่ ๑ แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงิน วัน ละ ๑,๔๗๐.๐๐ บาท (หนึ่ง พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๓๕๐.๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิฑูรย์ หม่อมปัสดี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายชนะ มงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสายโรจน์ ยอดอินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกฤติกา จุฑคง)

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1

พิมพ์

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สอจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON7005

3.1.12

3.2 กรณีแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับวงงานงวดเงิน (แก้ไขสัญญาที่กระทบวงงานและงวดเงิน)

3.2.1 กดปุ่ม

แก้ไขวงงาน งวดเงิน

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง					
ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	แล็บโปร				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3609900938029				
ประเภทสัญญา	สัญญาจ้างก่อสร้าง				
เลขที่สัญญา	22/2567	ดูรายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	30/04/2567				
เลขคณสัญญา	670422000004				
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	01/05/2567	จนถึง	26/12/2567	ระยะเวลาคงเหลือ	วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	1,877,000.00 บาท				
สถานะสัญญา	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว				
ประวัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง					
ฉบับแก้ไขครั้งที่	เลขที่	ลงวันที่	ประเภทการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลแก้ไขสัญญา
1	22/2567	30/04/2567	แก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญา	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด/แก้ไข

หมายเหตุ : 1. กรณีแก้ไขสัญญาที่กระทบวงงานงวดเงินให้เลือก **แก้ไขวงงาน งวดเงิน**

2. กรณีแก้ไขสัญญาที่ไม่กระทบวงงานงวดเงินให้เลือก **แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ**

แก้ไขวงงาน งวดเงิน **แก้ไขสัญญารายละเอียดอื่นๆ** **กลับสู่หน้าหลัก**

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง 3.2.1 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON0007

กรณีการแก้ไขข้อมูลวงงานงวดเงิน มี 3 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 แก้ไขมูลค่าสัญญา หมายถึง หน่วยงานของรัฐต้องการแก้ไขจำนวนเงินในงวดเงิน และ/หรือ จำนวนเงินในสัญญา

รูปแบบที่ 2 แก้ไขมูลค่าสัญญาและระยะเวลา หมายถึง หน่วยงานของรัฐต้องการแก้ไขจำนวนเงินในงวดเงิน และ/หรือ แก้ไขจำนวนเงินในสัญญา และต้องการแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบในงวดงาน และ/หรือ วันที่สิ้นสุดในสัญญา

รูปแบบที่ 3 แก้ไขจำนวนงวดงานและระยะเวลา หมายถึง หน่วยงานของรัฐต้องการแก้ไขจำนวนงวดงาน และ/หรือ จำนวนงวดเงิน และต้องการแก้ไขระยะเวลาการส่งมอบในงวดงาน และ/หรือ วันที่สิ้นสุดในสัญญา

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงจรงวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงจรงวดเงิน

3
Template
แก้ไขวงจรงวดเงิน

4
ตัวอย่าง
แก้ไขวงจรงวดเงิน

*การแก้ไขข้อมูล ☐ แก้ไขมูลค่าสัญญา ☐ แก้ไขมูลค่าสัญญาและระยะเวลา ☐ แก้ไขจำนวนงวดและระยะเวลา

ข้อมูลการดำเนินการสัญญาหรือข้อตกลง		จากเดิม		ใหม่	
*ระยะเวลาดำเนินการ		240	วัน	240	วัน
*วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่		01/05/2567	จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567
*จำนวนเงินตามสัญญา		1,877,000.00 บาท		1,877,000.00 บาท	

การแก้ไขวงจรงวดเงิน			
ลำดับที่	รายการส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	จำนวน งวดเงิน
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2	2

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 2. วิธีการบันทึกข้อมูล แก้ไขวงจรงวดงานและงวดเงิน
 3. คลิกที่ เลขลำดับที่รายการ ที่มี เพื่อแสดงรายละเอียดแก้ไขวงจรงวดงานและงวดเงิน

ยกเลิกรายการข้อมูล
บันทึกชั่วคราว
บันทึก
ไปขั้นตอนที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สจจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON8001

การแก้ไขมูลค่าสัญญา

3.2.2 คลิกที่ ☐ ของรายการแก้ไขมูลค่าสัญญา ระบบจะแสดง ☒

3.2.3 ระบุจำนวนเงินรวมตามสัญญาใหม่

3.2.4 คลิกที่ ชื่อรายการที่ส่งมอบ (ที่เป็นอักษรสีฟ้า) ระบบแสดงหน้าจอ งวดงานงวดเงิน

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงจรงวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงจรงวดเงิน

3
Template
แก้ไขวงจรงวดเงิน

4
ตัวอย่าง
แก้ไขวงจรงวดเงิน

3.2.2

*การแก้ไขมูลค่าสัญญา ☒

☐ แก้ไขมูลค่าสัญญาและระยะเวลา ☐ แก้ไขจำนวนงวดและระยะเวลา

ข้อมูลการดำเนินการสัญญาหรือข้อตกลง		จากเดิม		ใหม่	
*ระยะเวลาดำเนินการ		240	วัน	240	วัน
*วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่		01/05/2567	จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567
*จำนวนเงินตามสัญญา		1,877,000.00 บาท		1,870,000.00 บาท	

การแก้ไขวงจรงวดเงิน			
ลำดับที่	รายการส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	จำนวน งวดเงิน
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2	2

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 2. วิธีการบันทึกข้อมูล แก้ไขวงจรงวดงานและงวดเงิน
 3. คลิกที่ เลขลำดับที่รายการ ที่มี เพื่อแสดงรายละเอียดแก้ไขวงจรงวดงานและงวดเงิน

ยกเลิกรายการข้อมูล
บันทึกชั่วคราว
บันทึก
ไปขั้นตอนที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน

รายการที่ส่งมอบของ
ชื่อรายการที่ส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

จำนวนเงินตามสัญญา : 187,000.00
ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด
รูปแบบระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงาน ☐ จำนวนวัน ☒ วันที่

เดิม					แก้ไขใหม่เป็น				
จำนวนงวดงาน	งวด	จำนวนงวดเงิน	งวด	*จำนวนงวดงาน	งวด	*จำนวนงวดเงิน	งวด		
1	1	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00	
2	2	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00	
รวม		100.00		100.00	1,877,000.00			1,877,000.00	

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
2. วิธีการบันทึกข้อมูล **เพิ่มหรือลดจำนวนงวด**
3. วันที่กำหนดส่งมอบงาน ให้ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วันเดือนปี)

บันทึก ออก

3.2.5. คลิก ☒ หน้างานงวดเงินที่ต้องการแก้ไข

3.2.6 ระบุจำนวนเงินงวดที่แก้ไข (มูลค่าสัญญารวมต้องเท่ากับจำนวนเงินสัญญาที่แก้ไขใหม่)

3.2.7 กดปุ่ม

บันทึก

3.2.8 กดปุ่ม

ตกลง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement

egp3training.cgd.go.th บอกล่าว
ต้องการบันทึกข้อมูล ใช่หรือไม่

3.2.8

ตกลง ยกเลิก

รายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน

รายการที่ส่งมอบของ
ชื่อรายการที่ส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

จำนวนเงินตามสัญญา : 1,870,000.00
ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด
รูปแบบระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงาน ☐ จำนวนวัน ☒ วันที่

เดิม					แก้ไขใหม่เป็น				
จำนวนงวดงาน	งวด	จำนวนงวดเงิน	งวด	*จำนวนงวดงาน	งวด	*จำนวนงวดเงิน	งวด		
1	1	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00	
☒	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00	
รวม		100.00		100.00	1,870,000.00			1,870,000.00	

3.2.5

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
2. วิธีการบันทึกข้อมูล **เพิ่มหรือลดจำนวนงวด**
3. วันที่กำหนดส่งมอบงาน ให้ระบุเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (วันเดือนปี)

บันทึก ออก

3.2.7

3.2.9 กดปุ่ม **บันทึก** หน้าจอ บันทึกแก้ไขวงงานงวดเงิน

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงงานงวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงงานงวดเงิน

3
Template
แก้ไขวงงานงวดเงิน

4
ตัวอย่าง
แก้ไขวงงานงวดเงิน

*การแก้ไขข้อมูล ☒ แก้ไขมูลค่าสัญญา ☐ แก้ไขมูลค่าสัญญาและระยะเวลา ☐ แก้ไขจำนวนงวดและระยะเวลา

ข้อมูลการดำเนินการสัญญาหรือข้อตกลง		จากเดิม		ใหม่	
*ระยะเวลาดำเนินการ	240 วัน	240	วัน	240	วัน
*วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	01/05/2567 จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567
*จำนวนเงินตามสัญญา	1,877,000.00 บาท			1,870,000.00	บาท

การแก้ไขวงงาน งวดเงิน

ลำดับที่	รายการส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	จำนวน งวดเงิน
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2	2

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 2. **วิธีการบันทึกข้อมูล** แก้ไขวงงานและงวดเงิน
 3. คลิกที่ เลขลำดับที่รายการ ที่มี **✎** เพื่อแสดงรายละเอียดแก้ไขวงงานและงวดเงิน

ยกเลิกรายการข้อมูล
บันทึกชั่วคราว
บันทึก
ไปขั้นตอนที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก

3.2.9

3.2.10 ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนที่ 1 บันทึกแก้ไขวงงานงวดเงิน โดยรายการส่งมอบที่แก้ไขวงงานงวดเงิน เป็นตัวอักษรสีชมพู

กดปุ่ม **ไปขั้นตอนที่ 2**

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงงานงวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงงานงวดเงิน

3
Template
แก้ไขวงงานงวดเงิน

4
ตัวอย่าง
แก้ไขวงงานงวดเงิน

*การแก้ไขข้อมูล ☒ แก้ไขมูลค่าสัญญา ☐ แก้ไขมูลค่าสัญญาและระยะเวลา ☐ แก้ไขจำนวนงวดและระยะเวลา

ข้อมูลการดำเนินการสัญญาหรือข้อตกลง		จากเดิม		ใหม่	
*ระยะเวลาดำเนินการ	240 วัน	240	วัน	240	วัน
*วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	01/05/2567 จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567	01/05/2567	จนถึง 26/12/2567
*จำนวนเงินตามสัญญา	1,877,000.00 บาท			1,870,000.00	บาท

การแก้ไขวงงาน งวดเงิน

ลำดับที่	รายการส่งมอบ	จำนวน งวดงาน	จำนวน งวดเงิน
1 ✎	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2	2

หมายเหตุ : 1. รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล
 2. **วิธีการบันทึกข้อมูล** แก้ไขวงงานและงวดเงิน
 3. คลิกที่ เลขลำดับที่รายการ ที่มี **✎** เพื่อแสดงรายละเอียดแก้ไขวงงานและงวดเงิน

รายการส่งมอบที่แก้ไขวงงาน งวดเงิน

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
1	1	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00
รวม	100.00			99.80	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00

หมายเหตุ : รายการงวด **สีชมพู** หมายถึง งวดที่มีการแก้ไข

ยกเลิกรายการข้อมูล
บันทึกชั่วคราว
บันทึก
ไปขั้นตอนที่ 2
กลับสู่หน้าหลัก

3.2.10

3.2.11 ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนที่ 2 บันทึกเอกสารแก้ไขวงงาน วงเงิน กรอกข้อมูล C1 บันทึก เหตุผลสนับสนุนการแก้ไขวงงานวงเงิน กดปุ่ม **บันทึก**

3.2.12 กดปุ่ม **ไปขั้นตอนที่ 3**

1 บันทึกแก้ไขวงงานวงเงิน

2 บันทึกเอกสารแก้ไขวงงานวงเงิน

3 Template แก้ไขวงงานวงเงิน

4 ส่วน่างแก้ไขวงงานวงเงิน

รายละเอียดเอกสารแก้ไขวงงานวงเงิน

ข้อมูลผู้ซื้อ

B4 * ชื่อหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อนรณ 1)

B5 * สัญญาฉบับแก้ไขวงงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อนรณ 1)

B6 * จังหวัด นครราชสีมา

B7 * อำเภอ/เขต เมืองนครราชสีมา

B8 * ตำบล/แขวง นางนาค

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

B9 * ตำแหน่ง นาย

B10 * ชื่อ ธีรธรณ์

B11 * นามสกุล หม่อมปัสดี

ข้อมูลผู้ขาย

B12 * ชื่อผู้ขาย แสวันโปร

B13 * ที่อยู่สำนักงานใหญ่/บ้านเลขที่ ถนนเพชรเกษม

B14 * จังหวัด กรุงเทพมหานคร

B15 * อำเภอ/เขต คลองสาน

B16 * ตำบล/แขวง คลองตันโพธิ์

ข้อมูลจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

B17 ประเภทผู้ขาย ☒ นิติบุคคล ☐ บุคคลธรรมดา

B18 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ที่ สำนักงานทะเบียนในส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

B19 นำจากตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนในส่วนบริษัท (บันทึกเลขที่หนังสือรับรอง) สำนักงานทะเบียนในส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ 012345678

B20 หนังสือรับรองการจดทะเบียนวันที่ 01/06/2545 ระบุเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ (วาดคปปป)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

B21 * ผู้ลงนามเป็นผู้มอบอำนาจหรือไม่ ☐ มอบอำนาจ ☒ ไม่มอบอำนาจ

B22 หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ระบุเป็นนิติบุคคลในรูปแบบ (วาดคปปป)

B23 * ตำแหน่ง นาย

B24 * ชื่อ ชน

B25 * นามสกุล มงคล

ข้อมูลเอกสารสัญญา

B26 ตามสัญญาอ้างอิง สัญญาเลขที่ 22/2567 ลงวันที่ 30/04/2567 และสัญญาเลขที่ 22/2567 ลงวันที่ 30/04/2567

เหตุผลสนับสนุนการแก้ไขวงงานวงเงิน

C1 ☐ วัตถุประสงค์แก้ไขวงงานวงเงิน

หมายเหตุ : รายการที่มี **ดอกจันสีแดง** หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 ยกเลิกการกรอกข้อมูล **บันทึก** **ไปขั้นตอนที่ 3** กลับสู่หน้าหลัก

3.2.11 3.2.12

3.2.13 ระบบแสดงหน้าจอขั้นตอนที่ 3 Template แก้ไขวงงาน วงเงิน กดปุ่ม **บันทึก**

3.2.14 กดปุ่ม **ไปขั้นตอนที่ 4**

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึกแก้ไขวงจางานงวดเงิน 2 บันทึกเอกสารแก้ไขวงจางานงวดเงิน 3 Templateแก้ไขวงจางานงวดเงิน 4 ตัวอย่างแก้ไขวงจางานงวดเงิน

Template การแก้ไขสัญญา

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ <Field B2-สัญญาเลขที่>
ลงวันที่ <Field B3-สัญญาจัดทำเมื่อวันที่>

อ้างถึง <Field B26-ตามสัญญาที่อ้างถึง> ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
<Field C1-เหตุผลสนับสนุนการแก้ไข> เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๑,๕๐๐.๐๐			๕๓๑,๕๐๐.๐๐

Template มาตรฐาน ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2 บันทึก ไปขั้นตอนที่ 4 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สผจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON8001

3.2.13

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึกแก้ไขวงจางานงวดเงิน 2 บันทึกเอกสารแก้ไขวงจางานงวดเงิน 3 Templateแก้ไขวงจางานงวดเงิน 4 ตัวอย่างแก้ไขวงจางานงวดเงิน

Template การแก้ไขสัญญา

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ <Field B2-สัญญาเลขที่>
ลงวันที่ <Field B3-สัญญาจัดทำเมื่อวันที่>

อ้างถึง <Field B26-ตามสัญญาที่อ้างถึง> ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
<Field C1-เหตุผลสนับสนุนการแก้ไข> เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๑,๕๐๐.๐๐			๕๓๑,๕๐๐.๐๐

Template มาตรฐาน ย้อนกลับขั้นตอนที่ 2 บันทึก ไปขั้นตอนที่ 4 กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สผจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON8001

3.2.14

3.2.15 กดปุ่ม

บันทึกเลขที่และวันที่

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงจางงานวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงจางงานวดเงิน

3
Template
แก้ไขวงจางงานวดเงิน

4
ตัวอย่าง
แก้ไขวงจางงานวดเงิน

ตัวอย่างการแก้ไขสัญญา

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่
ลงวันที่

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๖ ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ให้ระบุเหตุผลที่แก้ไขวงจางงานวดเงิน เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินที่เหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 3

พิมพ์

บันทึกเลขที่และวันที่

กลับสู่หน้าหลัก

สำนักงานคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-127-7000 ต่อ 6951 - 6959 FCON8001

3.2.15

3.2.16 ระบุสัญญาเลขที่ สัญญาจัดทำเมื่อวันที่ และกดปุ่ม

บันทึก

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1
บันทึก
แก้ไขวงจางงานวดเงิน

2
บันทึก
เอกสารแก้ไขวงจางงานวดเงิน

สัญญาที่อ้างถึง

R1	* สัญญาเลขที่	22/2567	
R2	* สัญญาจัดทำเมื่อวันที่	30/04/2567	ระบุเป็นปีพุทธศักราชในแบบ (วาดคปปป)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่

บันทึก

ไปขั้นตอนที่ 2

กลับสู่หน้าหลัก

3.2.16

3.2.17 ก

ตกลง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement

egp3training.cgd.go.th บอกล่าว
ต้องการจัดเก็บข้อมูล ใช่หรือไม่

วันที่ 19
TrainEGP 9960 - หัวหน
องค์การปกครองส่วนที่

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึก
แก้ไขงวดงานงวดเงิน

2 บันทึก
เอกสารแก้ไขงวดงานงวดเงิน

สัญญาที่อ้างอิง

R1 * สัญญาเลขที่ 22/2567

R2 * สัญญาจัดทำเมื่อวันที่ 30/04/2567 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดดปปปป)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่ บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

3.2.17

3.2.18 กดปุ่ม

ไปขั้นตอนที่ 2

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึก
แก้ไขงวดงานงวดเงิน

2 บันทึก
เอกสารแก้ไขงวดงานงวดเงิน

สัญญาที่อ้างอิง

R1 * สัญญาเลขที่ 22/2567

R2 * สัญญาจัดทำเมื่อวันที่ 30/04/2567 ระบุเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดดปปปป)

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ยกเลิกการบันทึกเลขที่และวันที่ บันทึก ไปขั้นตอนที่ 2 กลับสู่หน้าหลัก

3.2.18

3.2.18 กดปุ่ม

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

1 บันทึก
แก้ไขงวดงานงวดเงิน

2 ตัวอย่าง
เอกสารแก้ไขงวดงานงวดเงิน

ตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๗ และสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๗ ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ให้ระบุเหตุผลที่แก้ไขงวดงานงวดเงิน เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินที่เหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๗	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๒๖/๑๒/๒๕๖๗	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

3.2.19

3.2.20 กดปุ่ม

ตกลง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement

egg3training.cgd.go.th บอกว่า
ต้องการดำเนินการขั้นตอนต่อไป ใช่หรือไม่

วันที่ 19
TrainEGP 9960 - หัวหน
องค์ประกอบส่วนที่

สัญญาและหลักประกัน > บริหารสัญญา > แก้ไขสัญญา

3.2.20

1 บันทึก
แก้ไขวงจางวดเงิน

2 ตัวอย่าง
เอกสารแก้ไขวงจางวดเงิน

ตัวอย่างร่างสัญญาหรือข้อตกลง

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๖ และสัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๖ ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ให้ระบุเหตุผลที่แก้ไขวงจางวดเงิน เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐
๒	๒	๒๖/๑๒/๒๕๖๖	๕๓๘,๕๐๐.๐๐			๕๓๘,๕๐๐.๐๐

ย้อนกลับขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป ดำเนินการขั้นตอนต่อไป กลับสู่หน้าหลัก

3.3 การดำเนินการหลังการแก้ไขสัญญา

เมื่อแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับวงจางวดเงินแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการต่อ ดังนี้

3.3.1 กดเลือก

รายการโครงการ

รายการโครงการ

3.3.1

3.3.2 กดเลือกเมนู

บริหารสัญญา

ของโครงการที่มีการแก้ไขสัญญาเกี่ยวกับวงงานงวดเงิน

4. รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการเสนอราคา

5. จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

6. จัดทำร่างสัญญา

7. ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา

8. ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

9. บริหารสัญญา

รายการผลการพิจารณา

3.3.2

3.3.3 คลิกที่

รายละเอียด

🏠

☰

🔍

ชื่อสัญญา	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่สัญญา		จำนวนเงินตามสัญญา	สถานะสัญญา/หลักประกัน	รายละเอียด
			ตั้งแต่	สิ้นสุด			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609900938029 - แล็บโปร							
แล็บโปร	22/2567	240	01/05/2567	26/12/2567	1,870,000.00	จัดทำสัญญา PO แล้ว/ผูกพัน	รายละเอียด

หมายเหตุ : ความหมายของสัญลักษณ์รูปภาพ ⚠️ : โครงการส่งมอบงานล่าช้า 🚫 : สัญญาหรือข้อตกลงส่งมอบงานล่าช้า
 ✎️ : แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ✖️ : ยกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
 : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง สีม่วง หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ข้อมูลงบประมาณโครงการ

กลับสู่หน้าหลัก

3.3.3

3.3.4 กดปุ่ม

ข้อมูลงบประมาณ

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ รวมรายการ

งวดงาน	วันกำหนดส่งมอบงาน	วันที่ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงินงวดที่	เลขคณตรงรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่งมอบตรวจรับงาน
รายการ 1 : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
งวดที่ 1	26/12/2567		1			รายละเอียด
งวดที่ 2	26/12/2567		2			รายละเอียด

หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)

งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงินตามสัญญา	จำนวนเงินคงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิกจ่ายเงิน
รายการ 1 : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
งวดที่ 1		938,500.00			รายละเอียด
งวดที่ 2		931,500.00			รายละเอียด

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
หลักประกันสัญญา	หนังสือค้ำประกันของธนาคาร	30/04/2567 - สิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา	93,850.00	ผูกพัน

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งระงับยกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

3.3.4

3.3.5 คลิกที่



ของงวดงานงวดเงินที่แก้ไขสัญญา

รายละเอียดงวดเงินงวดงาน

รายการที่ส่งมอบของ

ชื่อรายการที่ส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน

จังหวัด นราธิวาส อำเภอ/เขต เมืองนราธิวาส ตำบล/แขวง บางนาค

ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด

รูปแบบระยะเวลากำหนดส่งมอบงาน ☐ จำนวนวัน ☒ วันที่

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย	
1	1	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00	☒
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00	☒
รวม		100.00		100.00	1,870,000.00			1,870,000.00	

3.3.5

3.3.6 กดปุ่ม

สร้างข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมงวดเงินงวดงาน

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00

ข้อมูลการส่งมอบงาน งวดงานที่ : 2

*รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 50.00% ตามสัญญา

ข้อมูลการชำระเงิน งวดเงินที่ : 2

*รายละเอียดการชำระเงิน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

ข้อมูลรหัส UNSPSC และข้อมูลงบประมาณ

รหัส UNSPSC	รายละเอียด UNSPSC	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินงบประมาณ
72121102		2567				938,500.00 +
รวมเงิน						938,500.00

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

สร้างข้อมูล บันทึก ออก

3.3.6

3.3.7 บันทึกหรือส่งงบประมาณ และ จำนวนเงินงบประมาณที่มีการแก้ไขสัญญา

3.3.8 กดปุ่ม

บันทึก

รายละเอียดเพิ่มเติมงวดเงินงวดงาน

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00

ข้อมูลการส่งมอบงาน งวดงานที่ : 2

*รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 50.00% ตามสัญญา

ข้อมูลการชำระเงิน งวดเงินที่ : 2

*รายละเอียดการชำระเงิน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

ข้อมูลรหัส UNSPSC และข้อมูลงบประมาณ

รหัส UNSPSC	รายละเอียด UNSPSC	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินงบประมาณ
72121102		2567				931,500.00 +
รวมเงิน						931,500.00

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

สร้างข้อมูล บันทึก ออก

3.3.7

3.3.8

3.3.9 กดปุ่ม

ตกลง

log in egp3training.cgd.go.th user: เลขบัญชี ต้องการบันทึกข้อมูล ใช่หรือไม่

วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้ง จำนวนเงินตามสัญญา สถานะสัญญา

ระยะเวลาเหลือ วัน

3.3.9

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมงวดเงินงวดงาน

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00

ข้อมูลการส่งมอบงาน งวดงานที่ : 2

*รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 50.00% ตามสัญญา

ข้อมูลการชำระเงิน งวดเงินที่ : 2

*รายละเอียดการชำระเงิน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

ข้อมูลรหัส UNSPSC และข้อมูลงบประมาณ

รหัส UNSPSC	รายละเอียด UNSPSC	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินงบประมาณ
72121102		2567				931,500.00
รวมเงิน						931,500.00

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ล้างข้อมูล บันทึก ออก

3.3.10 กดปุ่ม

ออก

รายละเอียดเพิ่มเติมงวดเงินงวดงาน

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00

ข้อมูลการส่งมอบงาน งวดงานที่ : 2

*รายละเอียดงานที่ต้องส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน 50.00% ตามสัญญา

ข้อมูลการชำระเงิน งวดเงินที่ : 2

*รายละเอียดการชำระเงิน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

ข้อมูลรหัส UNSPSC และข้อมูลงบประมาณ

รหัส UNSPSC	รายละเอียด UNSPSC	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รหัสพื้นที่	จำนวนเงินงบประมาณ
72121102		2567				931,500.00
รวมเงิน						931,500.00

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ล้างข้อมูล บันทึก ออก

3.3.10

รายละเอียดวงเงินวงงาน

รายการที่ส่งมอบของ
 ชื่อรายการที่ส่งมอบ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้างหรือสถานที่ติดตั้งหรือสถานที่ปฏิบัติงาน
 จังหวัด นราธิวาส อำเภอ/เขต เมืองนราธิวาส ตำบล/แขวง บางนาค

ประเภทการจ่ายเงิน : จ่ายตามวงเงินที่กำหนด

รูปแบบระยะเวลากำหนดส่งมอบงาน ☐ จำนวนวัน ☒ วันที่

งวดเงิน	งวดงาน	ร้อยละของการส่งมอบ	กำหนดส่งมอบงาน	ชำระเงินอัตราร้อยละ	จำนวนเงิน	หักเงินล่วงหน้า	หักเงินประกันผลงาน	จำนวนเงินคงเหลือที่ต้องจ่าย	
1	1	50.00	26/12/2567	50.00	938,500.00			938,500.00	✓
2	2	50.00	26/12/2567	49.81	931,500.00			931,500.00	✓
รวม		100.00		100.00	1,870,000.00			1,870,000.00	

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูลวันที่กำหนดส่งมอบงาน ให้ระบุปีเป็นพุทธศักราชในรูปแบบ (ววดคปปปป)คลิกที่ เพื่อบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมวงงาน และวงเงิน

ดูรายละเอียดข้อมูลงบประมาณ
ออก
3.3.10

รายละเอียดวงเงินวงงาน

รายการข้อมูลงบประมาณ

ลำดับที่	รายการที่ส่งมอบ	จำนวนวงเงิน
1	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	2

ออก
3.3.10
