

ស៊ូលាញា ជំនួយកំរែង

សំណុល្យាលេខទៅ ២៩/២៥៦៨

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกurm อําเภอ/เขตเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนางวัณเรือน เทียนทอง นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.แอฟฟ์ลิติก ซึ่งจะเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๔๗ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง ทับพริก อําเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โดย นางมยุรี ไร์ทุกข์ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ จังหวัดสระแก้ว กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๗๓๕๕๑๐๐๐๒๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดกล่าวและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวหมูที่ ๑๔ สายคลุ่มบ้านประชารัฐ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระบุรีแก้ว ขนาดผิวน้ำราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาดังนี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดเดียวกันที่จะใช้ในงานจ้างตามสัญญาดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ให้อ่านส่วนหนึ่งของสัญญาฯ

- | | |
|---|---|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๔ (สิบแปด) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประทegานก่อสร้าง สูตรและ
วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
(๙ (เก้า) หน้า) |

ความไม่ดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ຕົວຢ່ານ)

(นางชวัญเรือง เที่ยนทอง)

ຜົວງາຈັງ

(ຄົງທີ່)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวัฒนาคร เลขที่ ๑๖๑๐๔๓๘๒๗๗๗๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๑,๒๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามาตรฐานให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกัน ตั้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าตาแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหรือนิกตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตั้งกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องห้ามหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบทั้งตามวรรคหนึ่งมาครอบให้แก่ผู้ว่าจ้างใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีค่าเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างคงเหลือจ่ายและผู้รับจ้างคงเหลือรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๐๒,๕๗๐.๐๙ บาท (สามแสนสองพันห้าร้อยเจ็ดบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการปรับพื้นที่ เสร็จเรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานคอนกรีตดาดฟ้าท่อ) ทำงานรายร่องพื้นบดอัดแน่น พร้อมเทคโนโลยี ท่อที่ ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อครัว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางชัยลักษณ์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๗๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้ทำงานทรายรองพื้น บดอัดแน่น พร้อมเทคโนโลยีที่เหลือทั้งหมด จำนวนพื้นที่ ๕,๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ทำการตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจร และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการแบบในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซึ่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสารแก้ว ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ท.แอดส์เพลติก เลขที่บัญชี ๒๓๖๑๖๕๒๔๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แต่ต้องรับผิดชอบ)

ข้อ ๕. (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่ถือมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิพลิวม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรืบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางมยุรี ไร่ฟ้า)



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ;
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตั้งกล่าววันนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาน้ำเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยับอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั่วไป (ก้าวี)

ความเสียหายได้ๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแคมให้ศีนต์หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดกาวร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในครั้ง น่า เช่น

(ଲେଖକ)

65

ជំរាប់ចំណាំ

(๖๗๙)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่ออุปจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ล้ำมี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสื่อมใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถือวันแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้หักสิน


(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางมุรี เรืองอรุณ)



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาเนื้หาการงานพิเศษนั้นๆ อญชื่อของข้อบข่ายทั่วไปแต่่วัตถุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจัง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๐.๕๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจังต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกเหนือนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นห้ามราสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

มนูรี บุญ
(นางมนูรี ไร่ทุกข์)



ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้หักต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเงินจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประจำกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญາได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประจำ ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญາแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญາที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงรถหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องถอนเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญາ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว และแต่กรรณ์

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวณัฐเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



นายวีระ พัฒนา

(นายวีระ พัฒนา)


ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและ วรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าว ไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำนักช่างซึ่งแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)


(ลงชื่อ)

(นางมยุรี ไรทุกาน)


สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างมากก่อสร้าง มีดังนี้
 ใช้สูตร $P = (P_0) \times (K)$
 เมื่อ P = ราคากำไรต่อหน่วยหรือราคากำรานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 P_0 = ราคากำรานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคากำรานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 แล้วแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรืออนุมัติเพิ่ม ๕%
 เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน
 K ที่ใช้
 $K = 0.30 + 0.10 Ct / Co + 0.40 Lt / Lo + 0.20 Mt / Mo + 0.10 St / So$
 $K = 0.30 + 0.10 Lt / Lo + 0.35 Ct / Co + 0.10 Mt / Mo + 0.15 St / So$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายต่อฝ่ายหนึ่งฉบับ




ပြုလုပ်မှုများ၊ ပိုမိုမှုပိုမိုမှုများ၊ ပိုမိုမှုပိုမိုမှုများ၊ ပိုမိုမှုပိုမိုမှုများ၊

1947년 3월 14일, 600 ㎡ 토지에 대한 권리가 인정되는 1,200,000 원의

၁၂၁၅ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ ၁၂၁၆ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာ

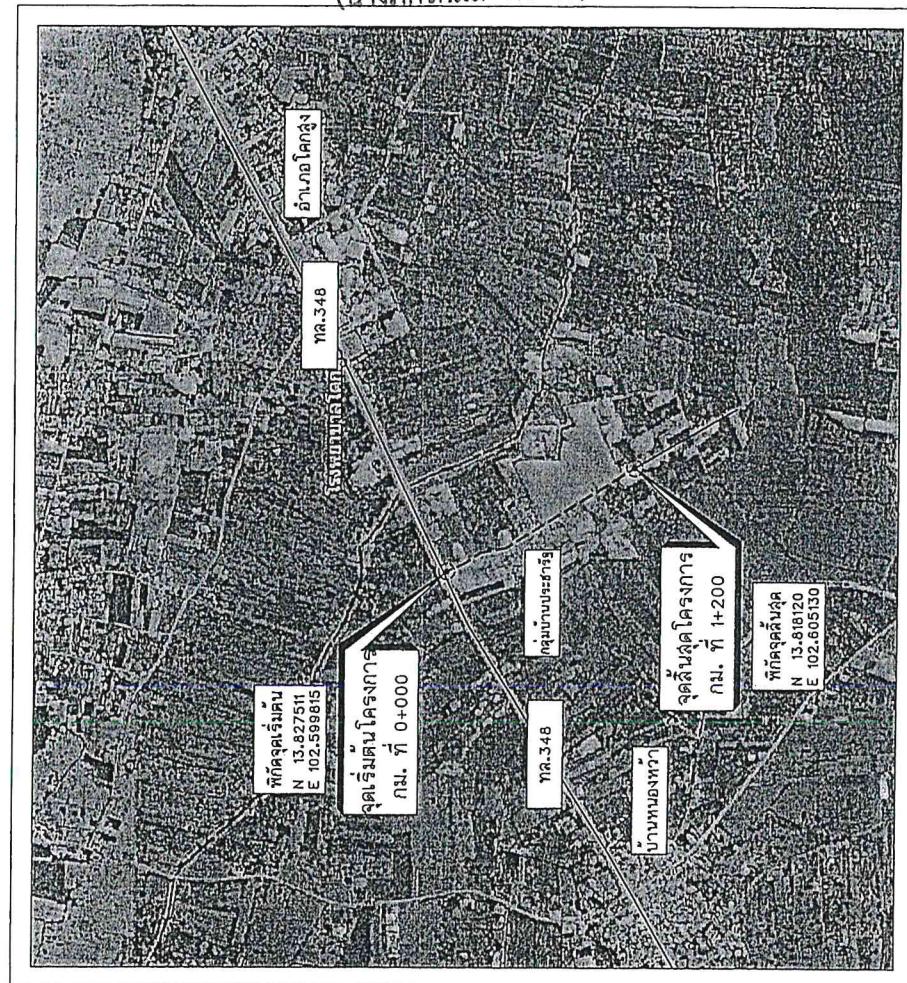

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....		๑๗๖/๒๕๖๙
ผู้เสนอ.....	ผู้รับ.....	ในจำนวน.....
แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่.....		
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	
(นางสาวณัฐเร่อน เทียนทอง)		
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	
(นายมานะ ใจรัก)		
(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	
(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)		
(ลงชื่อ).....	พยาน	
(นางก้อนกนก ทองใบ)		




ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

၁၄။ မြန်မာနိုင်ငြပ်မှု အဖွဲ့အစည်း မြန်မာနိုင်ငြပ်မှု အဖွဲ့အစည်း မြန်မာနိုင်ငြပ်မှု အဖွဲ့အစည်း

ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା କି ଏହା କାହାର ଦେଖିବାରେ ଏହାର ଅନୁଭବ ହେଲା ।

ລັດຕິບໍ່	ອະນາກົດ	ອະນາກົດ	ແຜນຖີ່	ໜ້າມຢ່າງເຊື່ອ
1.	ແຜນໜັກສຳຫັບ		1	
2.	ສາຂຸບັນແບນ ແລະ ອາຍະລະວົງລົງ		2	
3.	ແບບແສຈູນປົງມານາງານ		3	
4.	ແບບແສລະຫອດກໍານົດວັດທຶນກໍາຕົວສົການໃນປະເວນໄໝ		4	
5.	ແບບແສລະບັນປັນແລະ ລົງວົງຄົມມານາງ		5-7	
6.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ຕັນອອນນາກົດສົກສົມເລັກສໍາ ປະເທດກັກທີ 1 (ເຫັນຮອງເຫັນທາງສູງຮັກ)		8	ທີ່-2-201(1)
7.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ການຮັສຄົມເລື່ອໄດ້ຮອງຕອນນາກົດສົກສົມເລັກສໍາ		9	ທີ່-2-202
8.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ບໍາຍອດອະນຸມັງກອນສົກສົມແລະປໍາຍຸດອົນ		10	ທີ່-3-101
9.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ບໍາຍອດອະນຸມັງກອນສົກສົມແນະນຳ		11	ທີ່-3-107
10.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ກາຣີຕົກສັງປະປອດຈາດ (ແບບປັບປຸງເສີຍ)		12	ທີ່-3-108 (ຈົດ)
11.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ເຄື່ອງງາມຍອດອະນຸມັງກອນພິເສດວາງ (ເອົ້າສົນຈາວຈົດ)		13	ທີ່-3-110(ຈົດ)
12.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. RUMBLE STRIPS		14	ທີ່-3-114
13.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ກາວຈາກຫອຂອບນາງຢ່າງເປົ້າ ຄສລ. ຂົນດັກລົມ		15	ກຳ-5-101
14.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ຄອນກົດເຮົາຄອບປັບກົນການກົດຫານ້າກ່ອງຮອບນາງຢ່າງເປົ້າ ທັນດັກລົມ		16	ກຳ-5-103
15.	ແບບມາຮອງມານາການທາງສໍາກັບ ອປກ. ສອງນາມເນື້ອງຍານໄໝໄກກະເກີນ (ເລົກລົມ) ເຮັດມັນປາບຕົວສັບ ບາ (ຫຼຸດ)		17	ຂວາງຮັນ
16.	ແບບມາຮອງມານ ບໍ່ຢ່າງວຽກແລະປໍາຍາການ ອັກສາກົດປົກທາງຮ່ວມສັນກາວັດສອງແກ້		18	ປຸກສົມພົມ

บริษัทผลิตอุปกรณ์จราจร จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด		บริษัทผลิตอุปกรณ์จราจร จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด จำกัด	
1.	งานก่อสร้างถนนดอยตุงสู่เมืองหลัก ชานทางผ่านดอยตุงดอยตุงสู่เมืองหลัก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,200.00 เมตร หรือพื้นที่จราจรดอยตุงสู่เมืองหลัก ไม่แน่นอนกว่า 7,200.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงที่สถาบันกรังด์ปริญญาออกแบบ แล้วตามแบบที่สถาบันกรังด์ปริญญาออกแบบให้ไว้แล้วจะรับประกัน	เอกสารแนบท้ายที่ ๑ ผู้ว่าฯ ๑ แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ผู้รับเหมา ๑	เอกสารแนบท้ายที่ ๒ ผู้ว่าฯ ๒ แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ผู้รับเหมา ๒
2.	งานวางท่อระบายน้ำ ถนน ๔ สาย ล. ระยะ ๓ หมื่นเมตรต่อปี กองบัญชาการศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ	เอกสารแนบท้ายที่ ๓ ผู้ว่าฯ ๓ แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ผู้รับเหมา ๓	เอกสารแนบท้ายที่ ๔ ผู้ว่าฯ ๔ แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ผู้รับเหมา ๔
3.	งานปูปูนประปาส่วนพื้นที่โครงการ (เป้าแยกขาว) จำนวน 2 ป้าย		
4.	งานปูปูนประปาส่วนพื้นที่โครงการ (เป้าที่แยกขาว) จำนวน 2 ป้าย		
5.	ในคราวนี้แบบฟอร์มอื่นๆ แห่ง กองบัญชาการศึกษาจะมีแต่ในบันทึกการขออุดหนุน ให้บริษัทฯ ควบคุมงาน และของด้วยความรับผิดชอบ ไปที่วันเดียวกัน	(ลงชื่อ) ผู้จัดการ ลงชื่อ	(ลงชื่อ) ผู้จัดการ ลงชื่อ



พยาน

ပြုလောင်းများမှာ အမြတ်ဆင့် ဖြစ်သော ပြုလောင်းများ


卷之三

บริษัท พี.พี.พี. จำกัด บ1.ชลบุรี-๓๐.๙๖๑-๗๗๓ ให้เช่าแบบห้องสำนักงานและที่พักสำหรับผู้เช่า
รายเดือน ตั้งแต่ ๕๐๐-๒๐๐๐ บ.ต. ตั้งแต่ ๑๐๐๐-๕๐๐๐ บ.ต. ตั้งแต่ ๒๐๐๐-๕๐๐๐ บ.ต.
เบบบ ก ๙ ตึกมา. ๘๐๖-๒๕๔๙


ก็จะต้องมีการจัดการด้วยความรู้ความสามารถของผู้นำที่ดี ไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมาย แต่ต้องมีการวางแผน ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังต้องมีความตระหนักรู้ถึงความต้องการของลูกค้าและตลาด 以便สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้เมื่อจำเป็น

၁၂၆


ລັດປັບ	ອາຄາຫົວໜ້ານຍາ (ບັກ)	ເປັນຈັນ (ບັກ)	ພື້ນສູງ ໃນປະຫວາກສ	ພື້ນຊຸມ ຄາງປະກາດ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
ຈຳລວມ	ຫຼີ້ສາ (ຮອມປິສ)	ຫຼີ້ສາ (ຮອມປິສ)	ຫຼີ້ສາ (ຮອມປິສ)	ເອກສາ ນໍາມາການ.

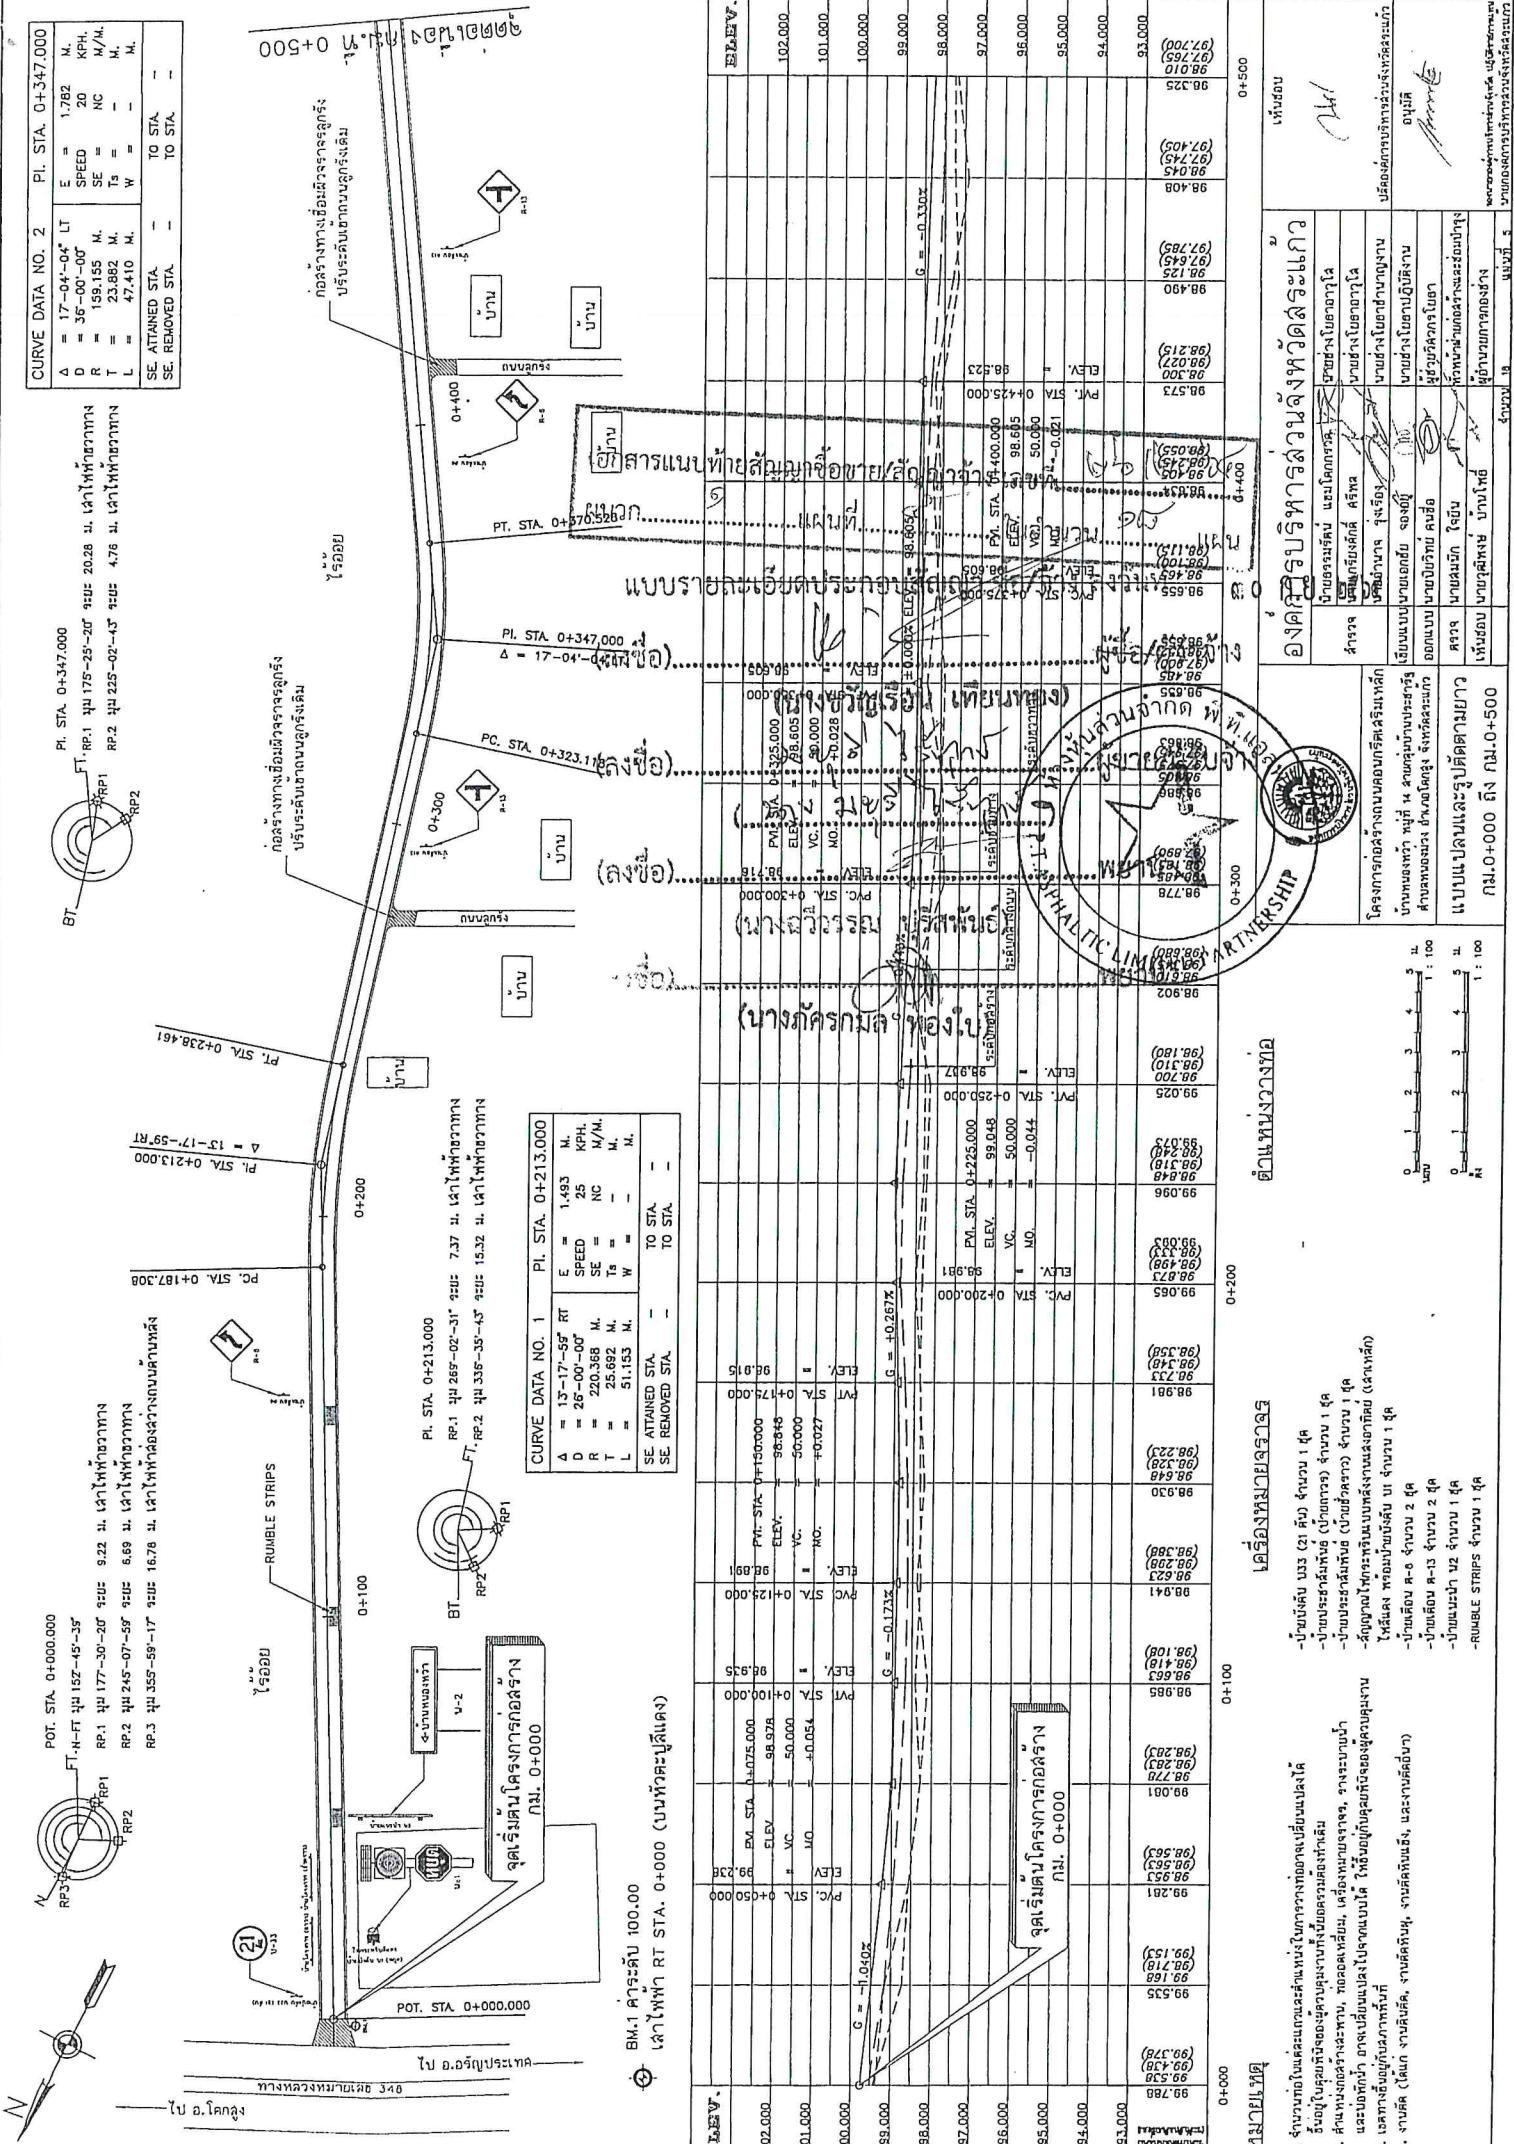

៤៩

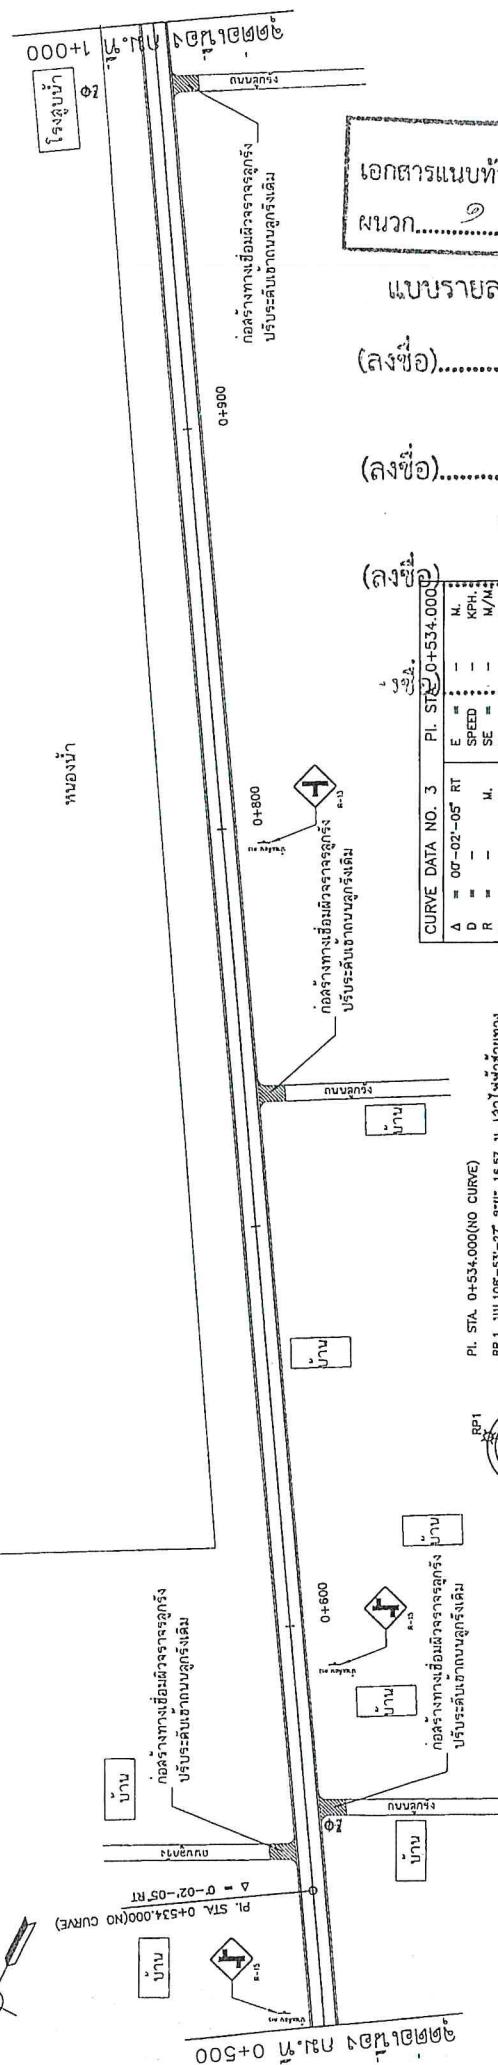

CURVE DATA NO. 3				PI. STA. 534,000.00			
A	B	C	D	E	F	G	H
00-02-05 RT				SPEED			M.
-				SE	-		KPH.
				TS	-		M./M.
				W	-		(2) M.
SEC. ATTAINED STA.	-						STA.
SEC. REMOVED STA.	-						STA.

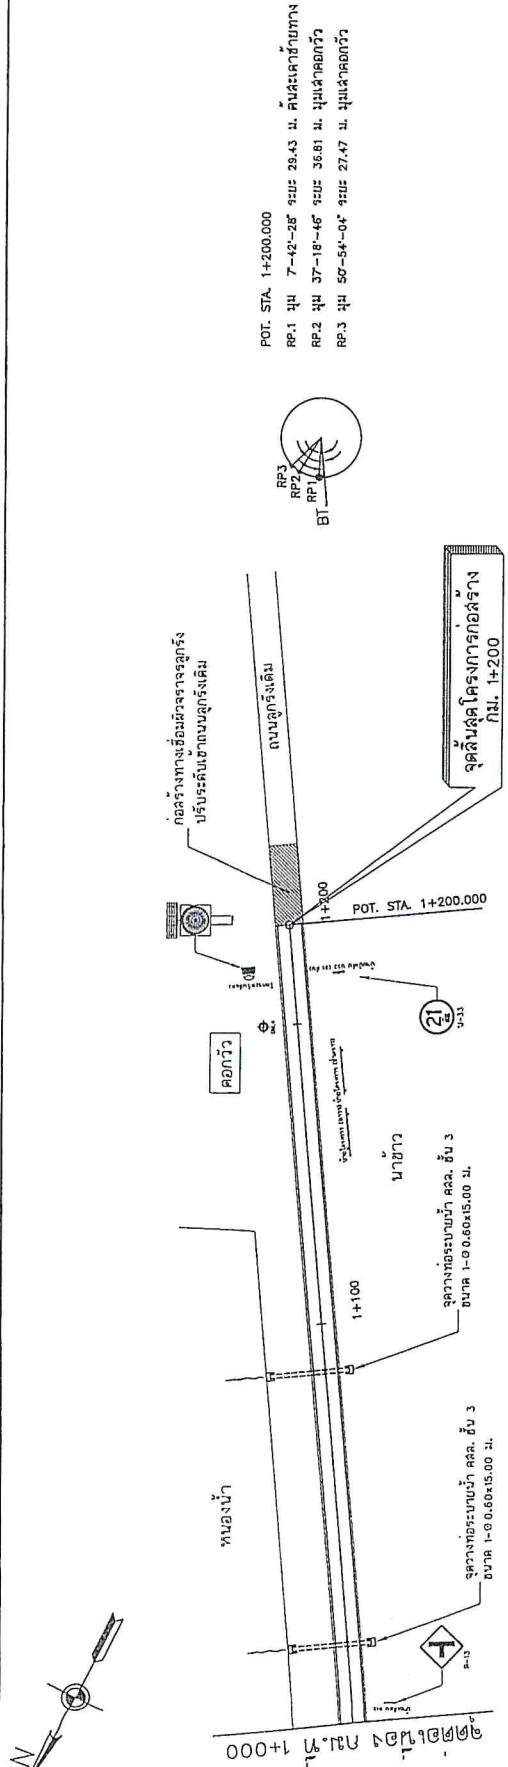

ឧប្បជ្ជ ៤ គិតចិប ៩៧.១៣៩
គមនាសំគាល LT STA. ១+១៧៥ (បុរាណបូសលេខ៨)

卷之三

ອົກສອນ


เจ้าพระยาเสนาบดีฯ ทรงรับการสั่งของเจ้าพระยาฯ ที่จะให้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ แต่เจ้าพระยาฯ ทรงต้องการให้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่

เดรางและองค์การต้นทาง (BACK SLOPE) และ
ลักษณะด้านข้าง (SIDE SLOPE)

ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ ଠିକ୍	ଶିଖ	ଶିଖ	ଶିଖ	ଶିଖ	ଶିଖ	ଶିଖ
	(ଲେଖ)	(ପାତା)	(ପାତା)	(ପାତା)	(ପାତା)	(ପାତା)
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:5:1	0.25:1	1:1

- ចំណេះវិវាទភាពបែងចាន់ : លេខេវ
- ប្រព័ន្ធផ្លាសកម្មសាខាការកំណត់ ថ្ងាតា 3.00 ហើយ នឹងបង្កើតផ្លូវទុន។
- រាជធានីសៀមរាប អង្គភាពប្រជាធិបតេយ្យ គម្រោង លក្ខ. -2-501
- ⑤ ការបង្កើតផ្លូវដែលមានការបង្កើតឡើងស្របតាមការណ៍រាជរដ្ឋាភិបាល

四庫全書

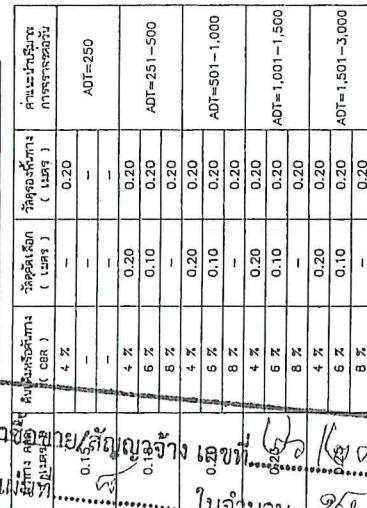


 กองทุนอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย	แบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
---	---

ฉบับที่ ๒๐๑๑/๔๕
วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

卷之三

ក្បាស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុង

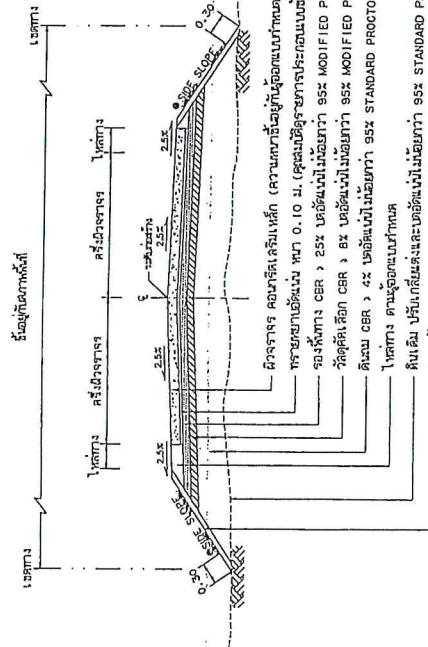

ก็เป็นไปได้ที่สัมภาระของคุณจะถูกหักห้าม

፩፻፭፻

(ลงชื่อ) 

(លេខី០)

(ສິນຫຼືວ)

(ຕິດຕັ້ງປຶກ)


၁၇၈

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(นางวัครกมล ห่องใจ)

卷之三


卷之三

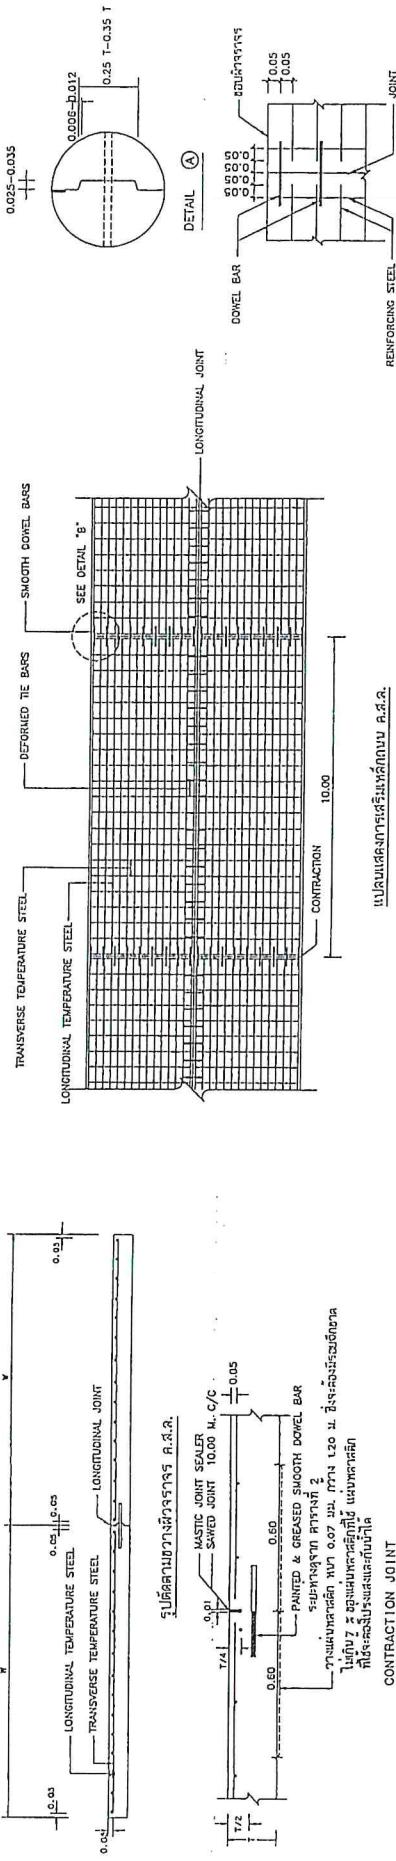


ගුරාග්‍රී I. TEMPERATURE STEEL

S. No.	SLAB THICKNESS (cm.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT LYNCHING SRB-2 (1.200 Tcs.)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (1.2750 Tcs) (Sq. mm/m)	LANE WIDTH (m)	TRANSVERSE REINFORCEMENT WIRE MESH (Sq. mm/m)	STEEL AREA DIAMETER/SPACING (Sq. mm/m)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA (Sq. mm/m)
15	9mm.Ø.28m.	227	99	3.00	6m.Ø.25m.	< 2.50	113
16	9mm.Ø.23m.	277	121	3.00	6m.Ø.20m.	< 3.50	141
20	9mm.Ø.20m.	316	139	3.00	6m.Ø.15m.	< 4.00	157
25	9mm.Ø.15m.	428	185	3.00	6m.Ø.15m.	< 2.50	113

1



הנפקה 20.UGM

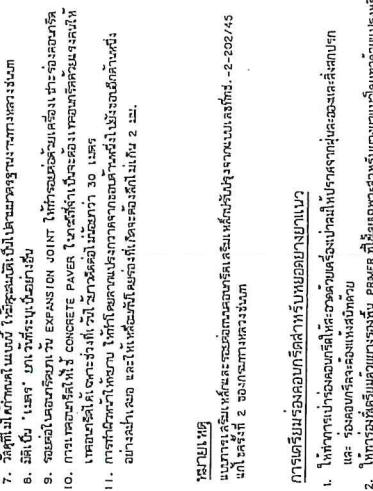



 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ	สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ	สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ	สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานฯ


การบริหารจัดการคุณภาพทั่วไปของบริษัทฯ

卷之三

แบบเรียนรู้ กđ-2-202 แผนที่ 13

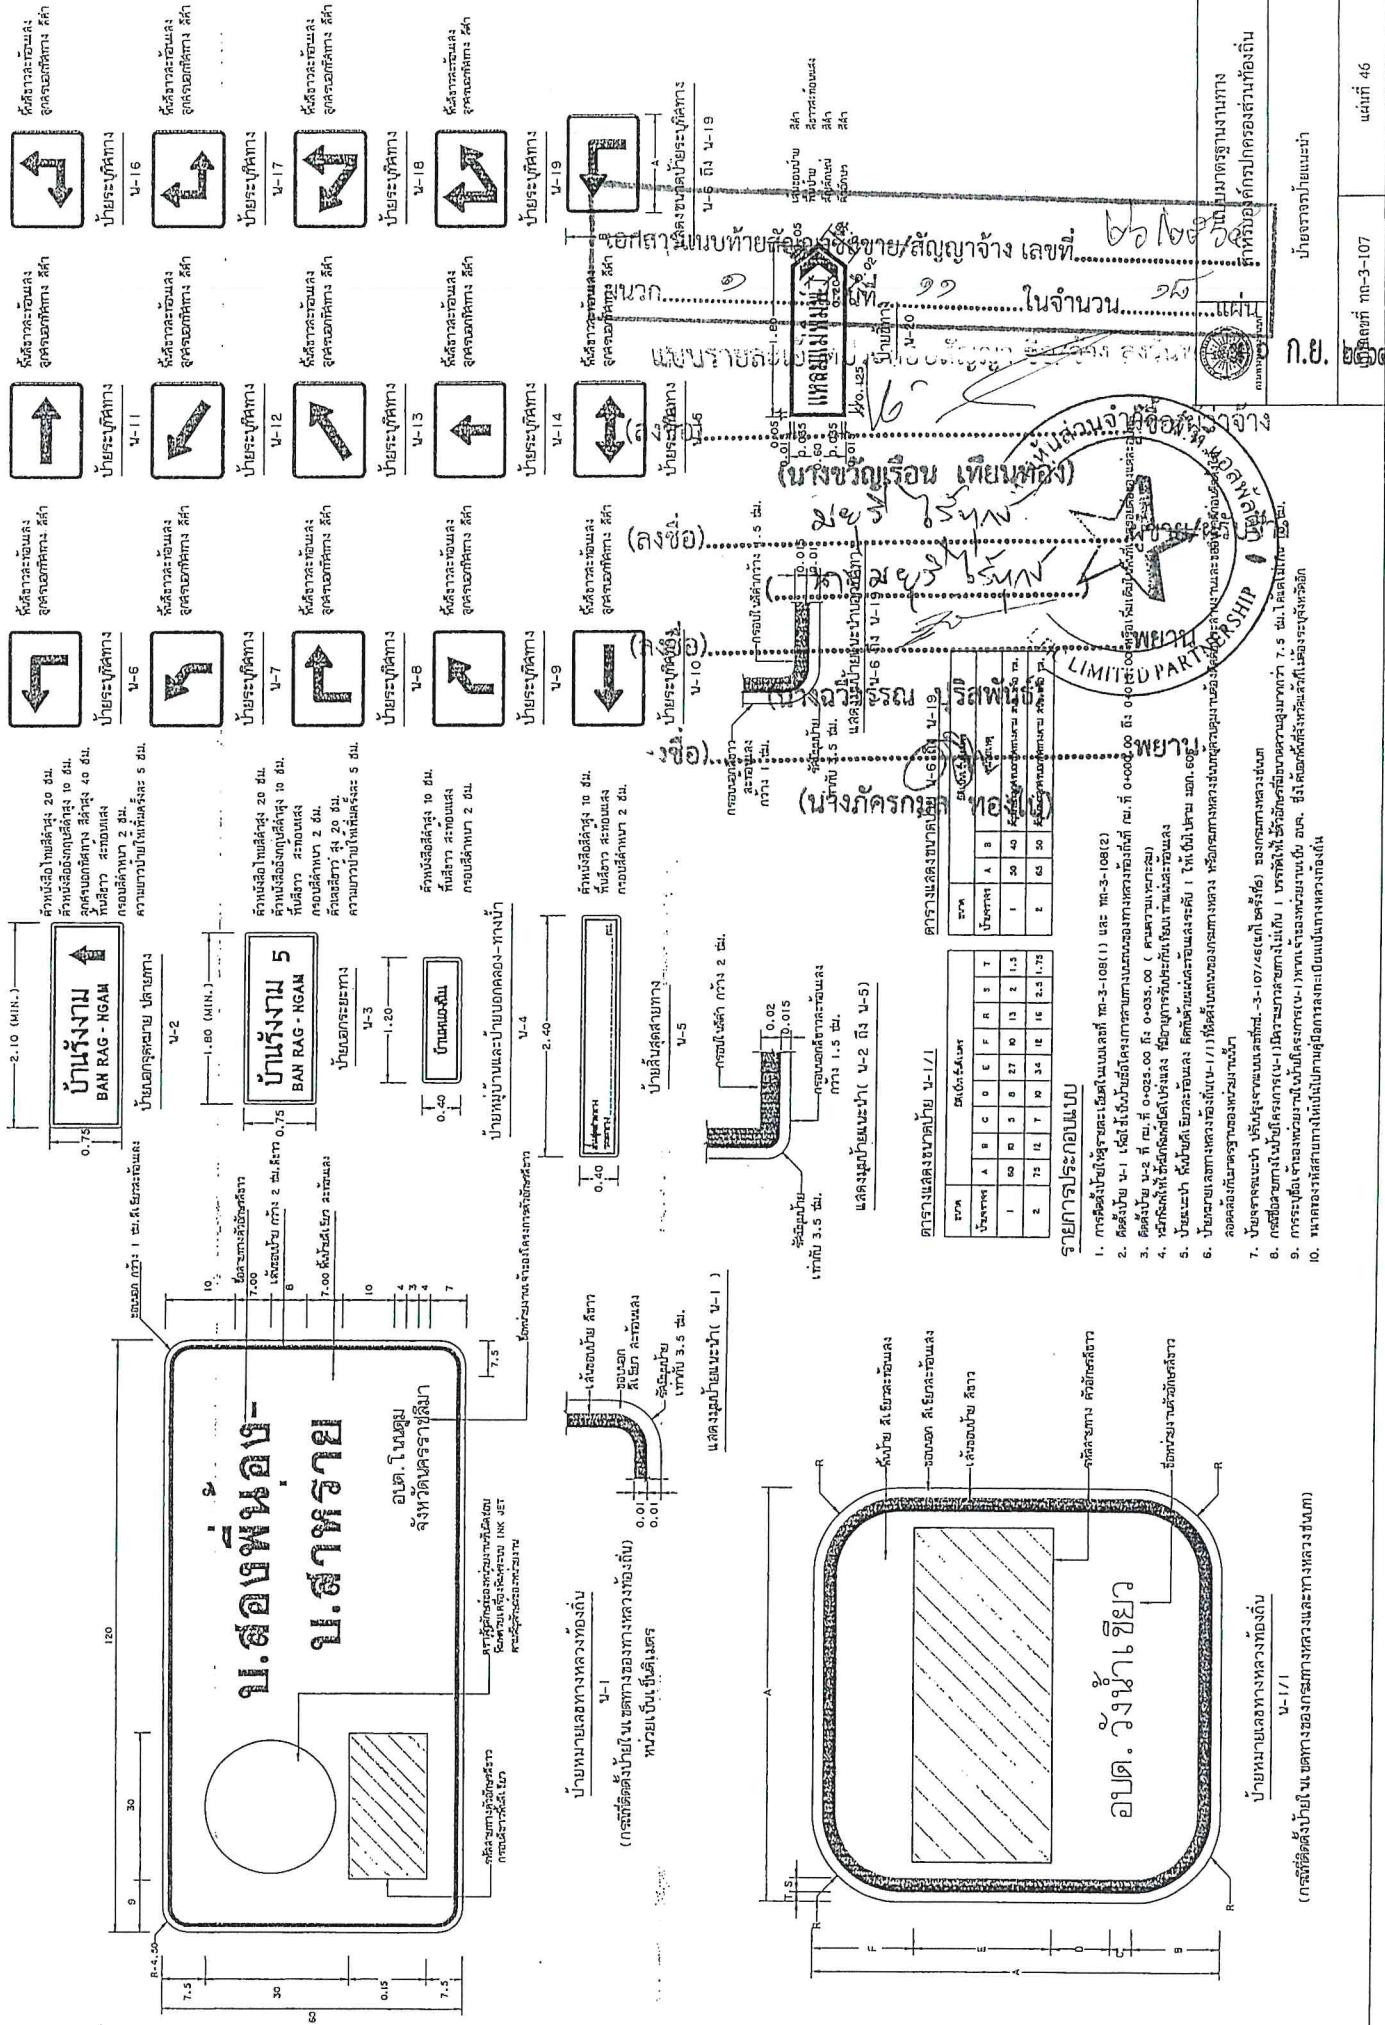

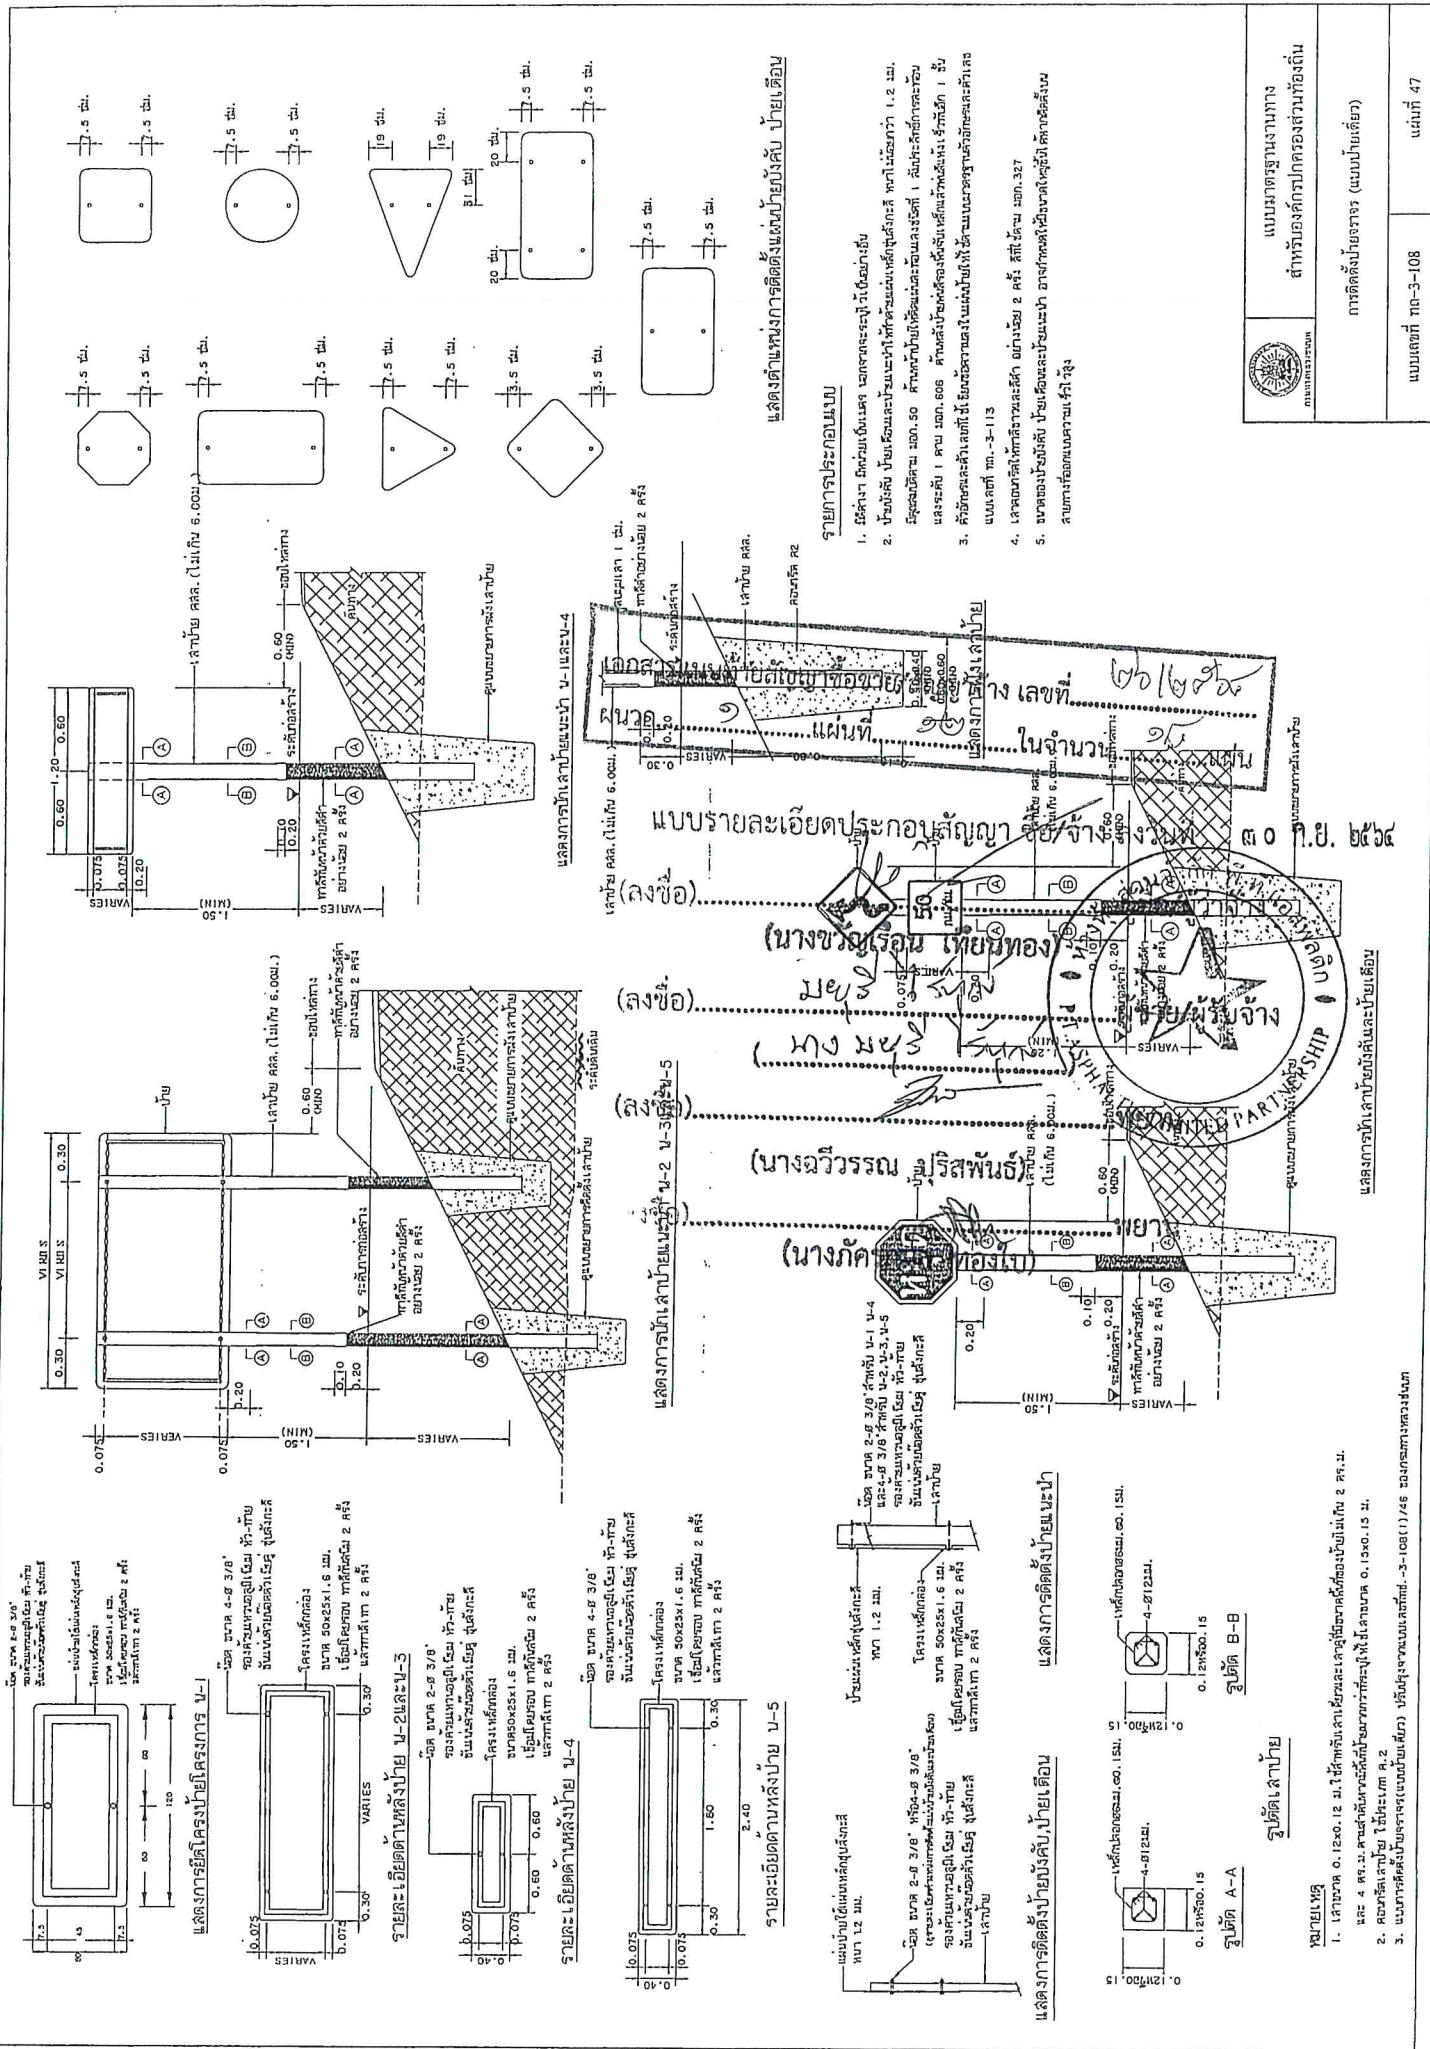

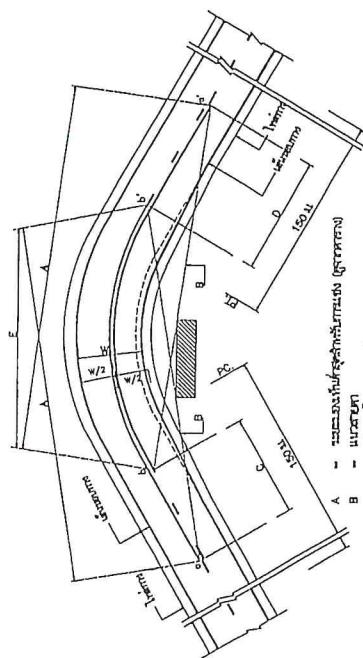

<p>(๑) ล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙</p> <p>แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑</p> <p>ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>ผู้สอน นางสาว _____</p>
<p>(๒) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙</p> <p>แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑</p> <p>ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>ผู้สอน นางสาว _____</p>
<p>(๓) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙</p> <p>แบบทดสอบภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑</p> <p>ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>ผู้สอน นางสาว _____</p>

(ลงชื่อ).....
(นางสาววีวรรณ บุริสพันธ์).....

๑๗๐).....(นางกัครกนถ ท่องใบ).....๘๘๒

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ହିନ୍ଦୁମାଳା

ଶର୍ମେଷ୍ଟିକାରୀ ପାଦପତ୍ର ପାଦପତ୍ର

ମୁଦ୍ରଣକାରୀ

ଯାହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନ୍ୟକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲିକାରୀ ହେଲାମୁଁ । ଏହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନ୍ୟକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲିକାରୀ ହେଲାମୁଁ ।

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ଯାହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନ୍ୟକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲିକାରୀ ହେଲାମୁଁ । ଏହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ୟାନ୍ୟକାଳୀନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲିକାରୀ ହେଲାମୁଁ ।

 กองทุนประกันสังคม	แบบฟอร์มฐานภาษี สำหรับผู้เสียภาษีคนพิการของรัฐบาลของคุณ	เครื่องหมายของจักรนิเวศวัฒนา (ตีลังกูรา)	แบบฟอร์มจดหมายความคุณภาพงาน (ตีลังกูรา)	แบบฟอร์มที่ กข-3-110 (1)	หน้าที่ 49
--	--	---	--	---------------------------------	-------------------

ପାତା ୧୦

เอกสารที่ได้รับการอนุมัติ

แบบเรียนที่ ๑๙-๓-๑๐ (๑) หน้าที่ ๔๙

เอกสารแนบท้ายร่างแบบขออนุญาต/สัญญาจ้าง เลขที่.....	6๖/๑๖๔
ผู้ว่าฯ..... ผู้รับอนุญาต..... ลงวันที่.....	๒๕๖๓/๐๘/๒๐๒๓
ผู้เสนอ..... ผู้รับอนุญาต..... ลงวันที่.....	๒๕๖๓/๐๘/๒๐๒๓
แบบรายละเอียดปูรองกอบสัญญาจ้าง ลงวันที่	

แบบ
(อธิบาย)

(นางชัวร์เรือน เทียนทอง)

(ຄົງຫົວ)

2005-05-04

(๖๙๗๕)

(សេវាទីរទន់ ០.៩៥ម៉ែត្រ)

三

(นางก้อนรอกน้ำ ทองเปี๊ยะ)

..ມະນາ

The diagram illustrates a cross-section of a road surface. A thick black line at the bottom represents the asphalt. Above it, a thin grey line represents the concrete shoulder. A vertical line labeled "RUMBLE STRIPS" runs parallel to the shoulder. The area between the shoulder and the rumble strips is shaded grey. Labels include "RUMBLE STRIPS" and "ASPHALT" for the shoulder, and "CONCRETE" for the shoulder material.

The diagram illustrates a runway with a dashed centerline. Along the left edge, there are two sets of diagonal hatching labeled "RUMBLE STRIPS". Above the runway, a dashed line represents the "Runway Edge Light". The diagram also shows a scale from 0 to 400 meters.


วิธีการประมวลผล
1. มีค่าคงที่ มีหน่วยเป็น เยกซ์ น
2. ตัวถูกคูณด้วย ภายนอก
3. การคำนวณได้จาก $R = \frac{N}{t}$
คุณสมบัติของเป็นผู้ดำเนินการให้แก่

 กองทัพบก	แบบมาตรฐานทาง ตัวหันลมศักดิ์สิทธิ์ของท่านหัวหน้าปีบ	RUMBLE STRIPS	แผ่นที่ 26
แบบเบอร์ ก-๒-๑๔			

แบบ สภมบดี สาธารณรัฐประชาชน彝族第-3-14/45 คณะกรรมการกลาง彝族

3. หางสันในชาติ RUMBLE STRIPS และ/หรือช่องลับบาร์เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทาง

3. ৎган់សាលាបីទុកដាក់ RUMBLE STRIPS នៃក្រុងផ្ទះបាយទិន្នន័យវាតាំង

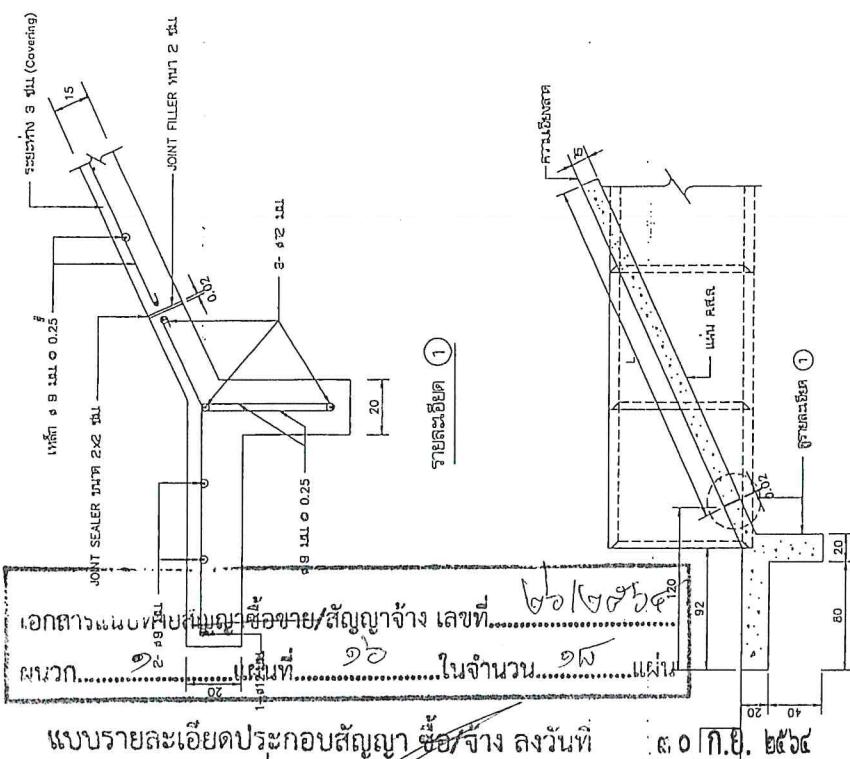


ແບບຮາຍຄະເວີດປະກອບສ້າງຢູ່ຈຳກັງ ລົງວັນທີ

ମୋଟାର୍ କେବଳ


(ลงชื่อ)..... ผู้สอน

(ลงชื่อ)..... วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....  MR. SAMUT PHANICHKUL
PARTNER

Digitized by srujanika@gmail.com

(ନାମିକଣ୍ଠ ହେବୁ)

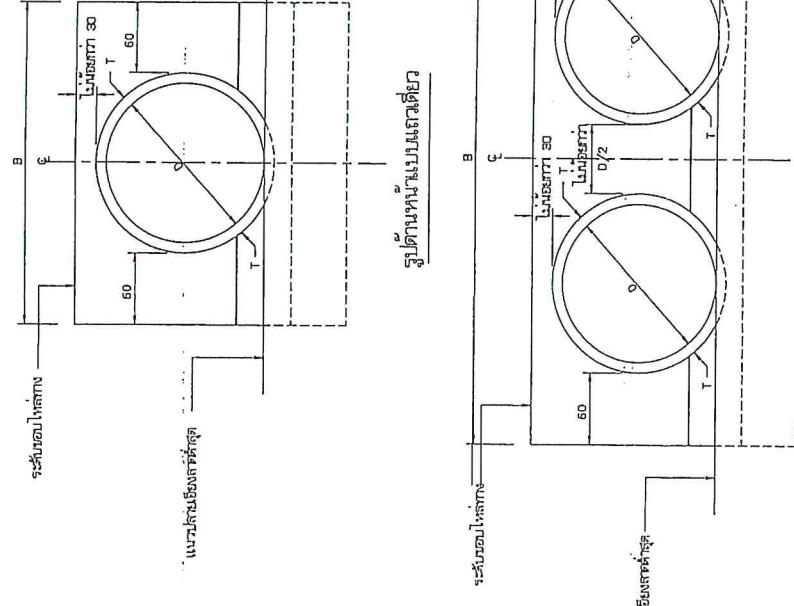

ဗြိုဟန်မြတ်စွာ

卷之三

ରାଜ୍ୟକାନ୍ତିକ
ପରିଷଦ

၁၂၃

1. ດັບຕົກ 1 ມານ່ວຍເປົ້າໃຫຍ່ແລະ ນອກຕາມບຸນໍານີ້ນີ້ຈຳເປັນ
 2. ສອງພົມໄກໃຫ້ເປົ້າ ແລະ ຄົນ ມານ່ວຍ
 3. ເລີ້ມຄົມຂອງອາຫຼືກໃຫ້ມາໃຫຍ່ ແລະ ພະຍາຍ
 4. ຮູ່ຂອງມາຮັດຕະໂຫຍດ (JOINT SEALER) ໃຫ້ຕົກຕະຫຼາມມາຮັດ
 5. ຄົນ ເຊື້ອ 475
 6. ອົງຊັກຕະໂຫຍດ (JOINT FILLER) ຜ່າມການຮັດຕະຫຼາມຕະຫຼາມນີ້ເປັນ

ພະຍາຍໃຫຍ່

ການຕະຫຼາມຕະຫຼາມ ຂອງການຕະຫຼາມຕະຫຼາມ

อนุฯ เก็บตัวอย่างต้นไม้และวัชพืช สำรวจพืชพรรณในเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ມະຫາວັດກາ

แบบมาตราฐานงานทาง
ส่าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคุณภาพฯ

The technical drawing illustrates the layout and dimensions of various navigation and communication equipment on a ship. Key components shown include:

- Searchlight:** Located at the top left, it features a U-SHAPE STAINLESS STEEL OR T-ROD and a REFLECTING SHEETING. The drawing specifies a height of 1.10 meters above the deck.
- Radar:** A circular device mounted on a mast, with a height of 0.10 meters above the deck.
- Bridge Equipment:** A large rectangular panel labeled "BRIDGE EQUIPMENT" with a height of 0.60 meters.
- Navigation Equipment:** A series of rectangular panels labeled "NAVIGATION EQUIPMENT" with a height of 0.20 meters.
- Compass:** A circular compass mounted on a vertical post, with a height of 0.10 meters above the deck.
- Chart Table:** A large rectangular table labeled "CHART TABLE" with a height of 0.80 meters.
- Chart Room:** A rectangular room labeled "CHART ROOM" with a height of 2.20 meters.
- Chart Table:** A second chart table labeled "CHART TABLE" with a height of 0.60 meters.
- Searchlight:** Another searchlight unit located on the left side of the bridge equipment, with a height of 0.10 meters above the deck.
- Searchlight:** A third searchlight unit located on the right side of the bridge equipment, with a height of 0.10 meters above the deck.
- Searchlight:** A fourth searchlight unit located at the bottom left, with a height of 0.10 meters above the deck.
- Searchlight:** A fifth searchlight unit located at the bottom right, with a height of 0.10 meters above the deck.

The drawing also includes various labels in Thai and English, such as "NOT TO SCALE", "NOTES", and "DIMENSIONS". A large circular stamp in the bottom right corner reads "AKINER SHIP" and "NOTES".

The technical drawing illustrates the layout and dimensions of various navigation equipment on a ship. It includes:

- A searchlight assembly mounted on a U-shaped or T-rod support, featuring a reflector sheeting and an LED light source.
- A radar unit with a circular dish antenna and a control console.
- A bridge equipment panel with multiple displays and controls.
- Dimensions for the searchlight housing (0.10 m), the U-shaped support (0.10 m), and the base plate (0.30 x 0.20 m).
- Dimensions for the radar unit (0.60 m height, 0.20 m width, 0.10 m depth).
- Dimensions for the bridge equipment panel (0.40 m height, 0.30 m width, 0.10 m depth).
- Notes indicating "NOT TO SCALE" and "比例尺 1:100" (Scale 1:100).
- Text in Thai providing instructions and notes related to the equipment installation and usage.

ใบแจ้งปริมาณงานและราคากำ

โครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบัวแมทอนหัวว้า หมู่ที่ 14 สายคลุ่มบ้านประชารัฐ ตำบลลหุนองเมือง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระบุรี หน่วยงานเข้าแข่งขันโครงการ องค์การบริหารส่วนตัวบ้านหัวแมกระดับท้องถิ่น

ผู้ยื่นขอเสนอ พ่างทันส่วนจำกัด พ.ต.อ.สอนพิลทิก


ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ราคากำไร	รวมราคากำไร	ราคาก่อสร้าง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานด่างป่าและขุดตื้อ							
2.1	1.1.1	งานด่างป่าและขุดตื้อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	#####	1.00	4,800.00	50.00	240,000.00	244,800.00
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.1.1	งานหินรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	360.00	750.00	270,000.00	50.00	18,000.00	288,000.00
	2.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5.1	2.2.1	งานปูหินทับสูง	ลบ.ม.	150.00	180.00	27,000.00	50.00	7,500.00	34,500.00
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีตแบบชน. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	#####	350.00	2,520,000.00	50.00	360,000.00	2,880,000.00
7.2	3.1.2	รอยต่อเนื่องตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	720.00	100.00	72,000.00	50.00	36,000.00	108,000.00
7.3	3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	#####	40.00	48,000.00	50.00	60,000.00	108,000.00
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	30.00	1,100.00	33,000.00	50.00	1,500.00	34,500.00
8.2	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) ขุดตื้นกว้างท่อ	ลบ.ม.	48.00	20.00	960.00	50.00	2,400.00	3,360.00
	6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
11.1	6.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- □ 0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - □ 0.60 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1(DWG.NO.DS→104)	EACH	2.00	4,400.00	8,800.00	50.00	100.00	8,900.00
	7	งานติดตั้ง							
12.1	7.1	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27	ชุด	8.00	2,800.00	22,400.00	-	0.00	22,400.00
12.2	7.2	ป้ายจราจรแบบ บ33	ชุด	2.00	3,700.00	7,400.00	-	0.00	7,400.00
12.3	7.3	ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	1.00	7,700.00	7,700.00	-	0.00	7,700.00
12.4	7.4	สัญญาณไฟกระพริบแบบหลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1.00	15,900.00	15,900.00	-	0.00	15,900.00
12.5	7.5	สัญญาณไฟกระพริบแบบหลังงานแสงอาทิตย์+ป้าย บ1	ชุด	1.00	18,500.00	18,500.00	-	0.00	18,500.00
	8	งานที่เส้นจราจร							
13.1	8.1	สีเคลือบเงาสีขาว/เทา/สีเขียว ท้ายสัญญาณจราจร/สัญญาจราจร เลขที่.....	ตร.ม.	420.00	250.00	105,000.00	-	0.00	105,000.00
13.2	8.2	Rumble Strips	ตร.ม.	7.14	400.00	2,856.00	-	0.00	2,856.00
ผู้ร่วม	แผ่นที่..... ใบ..... ในจำนวน..... แผ่น							

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่าจ้าง ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจันทร์ เกี้ยวนะจุ้ย) สังกัด พนักงานบริษัทฯ

(continued)  SUBJECT

ร่วมค่าใช้จ่าย

21. $\omega_0 \rightarrow$ 

[Handwritten signature]

(นางกัครกมล ทองใบ)

รวมค่างาน	3,889,816.00
ค่าใช้จ่ายทั่วไป	735,184.00
ค่างานหั่งลีน	4,625,000.00

ใบเสนอราคาจัดซื้อสิ่งของโดยวิธีคัดเลือก



เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้าชื่อ นันลักษณ์ พลพัฒนา สำเนาที่ ๓๔๗ ม.๗
ถนน..... ตำบล/แขวง ทับพริก อำเภอ/เขต เมือง ปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
โทรศัพท์..... โทร..... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็น
บุคคลธรรมด้าให้ใช้ขอความร่วม) ข้าพเจ้า นาย นฤทธิ์ ไกรฤทธิ์ อายุบ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... จ. ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..... โทรศัพท์.....
โดย..... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐ ซึพรับจ้างมาก่อนสร้าง และไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างสถาปัตย์และออกแบบอาคารเสริมเหล็ก
บ้านหนอน หมู่ที่ 14 ตำบล ปะซุรุก อำเภอ หนองม่วง
บ้านหนอน หมู่ที่ 14 ตำบล ปะซุรุก อำเภอ หนองม่วง
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการละเอียดแห่งขอบเขตของงาน ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งบริษัทงานและราคาน้ำเงินเงินหักเดือน 4,625,000 บาท
สัญญาจ้างและแปลงที่ดิน หนองม่วง หนองบัว หนองบัว) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอี้เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอาจรับคำเสนอี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
เวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบตามเงื่อนไขที่ขอบเขตของงานกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายขอบเขตของงานหรือตามที่สำนักงาน
อัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงาน
เอกสารแบบฟอร์มที่ดูแลโดยที่ดูแลด้วยตัวเองในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลาง
หน่วย จำนวนที่ได้รับที่น้ำเงินไม่ในส่วนของค่าจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง

แบบฟอร์มเบอร์ที่ ๘๙๘ ลงวันที่ ๒๖๐๙๒๔
(ลงชื่อ) นายชัยวุฒิ เทียนทอง
(ลงชื่อ) นาย นฤทธิ์ ไกรฤทธิ์
(ลงชื่อ) นางนฤมาล พยาน
(ลงชื่อ) นางสาววรรณ บุรีสพันธ์
(ลงชื่อ) นางภัครกฤษ ทอยใบ
พยาน

๕๐ ก.ย. ๒๕๖๔

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ ๕๑ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ นายภัครกฤษ ทอยใบ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นางนฤมาล พยาน กรรมการ

ลงชื่อ นายชัยวุฒิ เทียนทอง กรรมการ

๒./หากข้าพเจ้า.....



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสรงแก้วรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีขอใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมี
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วจากเรียกคดีเลิกอกใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะหรือ
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๔. ใบเสนอราคาคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทอุตสาหกรรม และประกาศจากกลั่นอัดหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ

เสนอมา ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลงชื่อ..... หมายเหตุ บัญชีหัก
(..... ลง หมายเหตุ บัญชีหัก)
ตำแหน่ง.....

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "ไทยโพลีเมอร์พลาสติก จำกัด" at the top and "THAI POLYMER PLASTIC LIMITED" at the bottom. The inner circle features a five-pointed star in the center, with the word "ผู้เสนาอราคা" written across it.

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... วันที่.....
ผนวก..... ๑ แผ่นที่..... ๒ ในจำนวน..... ๒ แผ่น


คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก


၅, ၁၇၂၀၂၀

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อห้าง ลงวันที่	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒	๒๖	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....		ลงชื่อ	นายจิตต์ราตน์
(ลงชื่อ).....		ลงชื่อ	นายมุตระ差รัตน์
(ลงชื่อ).....		ลงชื่อ	นางกิติราษฎร์ พูลสวัสดิ์
(ลงชื่อ).....		ลงชื่อ	นายพิชัยวัฒน์ ไชศรี
สำเนาถูกต้อง 			
(นางกิติราษฎร์ พูลสวัสดิ์)			

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเกทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ 
(นางชัยเรือน เทียนทอง)



ลงชื่อ 
(นางวารณ์ บุริสพันธ์) พยาน

ลงชื่อ 
(นางกฤศิมล ทองใบ) พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้ร่าง.....	ผู้รับ.....
ผู้ร่าง.....	ผู้รับ.....
ผู้ร่าง.....	ผู้รับ.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ บริษัทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดก่อสร้างที่ติดต่อสั่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดร่างซ่อมอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คืนแต่สั่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ส่วนที่ต้องจัดทำโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนัดสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้บังคับ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาข้างด้านขวาของงานนั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ หรือไม่ทั้งก้าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการนัดสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้บังคับ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง คณะกรรมการที่ต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้ออกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินกืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง โดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในขั้นตอนสั่นกงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

กำหนดให้ $P = (PO) \times (K)$

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาเดิมแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๑๗๑	ผู้จัดหัว
ผู้รับ.....	แผ่นที่.....	ในจำนวน.....
.....		

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บิมเบี้ยน สรรวิทยาน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั่ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุลึกลงด้านใน ข้างนอก แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถึงท่อเมนjamin น้ำ แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบห้องหรือระบบส่ายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องก๊าซ สายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารนั้นทางน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินดม ดินตัก ห่างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดิน การตักดิน การบดขัดดิน การบดเปลี่ยนหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุด-ผสมบดอัดแน่นเข็อน คลาย กันคล่อง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการบดดินให้หมายความถึง การบดดินหรือรายหรือสัดส่วน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดดังนี้ รวมทั้งมีการบดขัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่น เศษเดียว กันงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.40 \frac{Et}{E_0} + 0.20 \frac{Ft}{F_0}$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... วันที่..... แห่งที่..... ในจำนวน..... แห่ง

2.2 งานพินเรียง หมายถึง งานพินขนาดใหญ่ ผ่านมาเรียงกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จัดได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพินใหญ่จะแซมด้วยพินย่อหรือกราวคนาดต่าง ๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและเมื่อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องขักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพินที่ งานพินเรียวายานา หรืองานพินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลูกตัวลิงและห้องลับน้ำ

$$\text{ໃຫ້ສູງ} \quad K = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{Et}{Eo}$$

2.3 งานเจ้าระเบิดพืชนิ นายถึง งานเจ้าระเบิดพืชนิทั่ว ๆ ไป ระยะทางขันเข้าไป - กลับ
ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจ้าระเบิดอื่นคงคู่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีทันสมัย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15I_t/I_0 + 0.10M_t/M_0 - 0.20E_t/E_0 + 0.10F_t/F_0$$

អំពើទី ៣ សារធានា

3.1 งานพื้นทราย PRIME COAT TACK COAT SEAL COAT

$$K = 0.30 \pm 0.40 \text{ At/At} + 0.20 \text{ Et/Et} + 0.10 \text{ Et/Et}$$

3.2 งานผิวน้ำ SUBFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$K = 0.30 \pm 0.10 \text{ Mt/Mg} + 0.30 \text{ At/As} + 0.20 \text{ E}^t/\text{E}_0 + 0.10 \text{ E}_t/\text{E}_0$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE PENETRATION MACADAM

$$K = 0.30 \pm 0.10 \text{ Mt/Mg} \pm 0.40 \text{ At/Ag} \pm 0.10 \text{ Et/E}_2 + 0.10 \text{ Et/E}_3$$

3.4 งานพิวตันนกอนกริตเสริมเหล็ก หมายถึง พิวตันนกอนกริตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กดีออบ (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกริตเสริมเหล็กบริเวณซอสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานภาคคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปและบริเวณลักษณะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่นิยมกษณะด้วยคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Ct/Ce + 0.20Mt/Mo + 0.25St/SO$$

3.7 งานโครงการหนึ่งเดือน หมายความว่า พิจารณาให้ถูกต้องตามกำหนดนัด โครงการหนึ่งเดือน ติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงการหนึ่งเดือนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงการหนึ่งเดือนส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ໃຫ້ສຸກ} \quad K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/C_0 + 0.20Mt/Mo + 0.40St/S_0$$

អនុវត្តទី ៤ យានមេដ្ឋានរាជការ

4.1 งานอาคารชุดประทานไม่รวมนานาห้องห้องตั้ง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รังแทะ สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชุดประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีนานระบายน้ำห้อง แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชุดประทานประกอบของเรือน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{St}{So}$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ที่ส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห้องคอมและห้องซ้อมประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/S_o$$

4.3 งานบานะนรระบาย TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานะนรระบายเหล็ก เครื่องกว้านและโกรงขก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.45 \frac{Gv}{Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบบทะผ้าสั้น หรืออาคารชุดประทานประกอบของเชื่อม
ซึ่งมีลักษณะแยกจ่าวยดพะวงงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ໃຊ້ສຕຣ} \quad K = 0.25 + 0.15It/I_0 + 0.60 St/S_0$$

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณค่าต่างหากของงานฝ่ายทางระบบยึดล้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เกิดราคานี้เม้นต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ตัวเพิ่มราคางานซีเมนต์ ที่กระหวงพานิชย์ขัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวด ราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสารารถบัญชา

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนี่ยวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในการณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้ราก.....	แผ่นที่.....
.....	ในจำนวน.....
.....	แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอิม็อกส์สั่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดอย่างร้าย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะปี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประมาณางานและสุดว่าด้วยไปเมื่อเฉพาะงานก่อสร้างของภาคราชพ้าฝ่ายยศิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าอย่างร้าย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าอย่างร้าย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยถักขณา
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (balken BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างร้าย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง^{ที่}
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างร้าย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายซื้อขาย/ตัญญาจ้าง เลขที่.....	๑๗๗๖๘
ผู้ราก.....	ผู้รับ.....
แผ่นที่.....	จำนวน.....
แผ่น	

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$$

ประมาณงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร

$$K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร

$$K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$$

ตัวบ่งค่าที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวบ่งค่าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวบ่งค่าผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ตัวบ่งค่าซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวบ่งค่าซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ตัวบ่งค่าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวบ่งค่าวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ตัวบ่งค่าเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวบ่งค่าเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ตัวบ่งค่าเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวบ่งค่าเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ตัวบ่งค่าแอลฟ์ล็อกโนเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวบ่งค่าแอลฟ์ล็อก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = ตัวบ่งค่าเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวบ่งค่าเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ตัวบ่งค่านำ้มันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวบ่งค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = ตัวบ่งค่าท่อซีเมนต์ไนทิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวบ่งค่าท่อซีเมนต์ไนทิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PVCt = ตัวบ่งค่าท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ลงวันที่..... ๒๐ ในจำนวน.....๘๙๘๘
แผ่นที่.....๑.....

PVC ₀	= ตัวน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
GIP _t	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
Pet	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
WT	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามดักษณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวน้ำรากาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามดักษณะของงานนี้ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งนำทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสับพันธ์ (เบรเยนเทียน) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสับพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นี้ ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เสื่อมเสื่อมตามระยะเวลาในสัญญา โดย เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบตัวน้ำรากาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงบประมาณ

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญารับ เลขที่..... ๑๖/๒๕๖๔
ผูก..... แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน..... แบบ.....
